Lima, 20 de marzo de 2026

**Carta N° 000173-2026-NEMAEC/PRESIDENCIA**

Señor:
**RONALD RODRIGO QUISPE GALARZA**
Jefe de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales - UGPE
FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES
Presente. –

Asunto: Requerimiento de informe y documentación técnica respecto a observaciones advertidas en la intervención de mantenimiento de la CPNP Collique-Comas.

Referencia: a) OFICIO N°000103 -2026-MIDIS/FONCODES/UGPE
b) INFORME N°024–2026–FONCODES/UGPE/SUP–JLPM

De mi especial consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al documento de la referencia, mediante el cual se solicita un informe situacional detallado sobre el estado actual de la ejecución de la intervención en la CPNP Collique.

Al respecto, se remite la siguiente documentación:

1. **INFORME TECNICO N°019-2026-NEMAEC-LACC-CPNP_COLLIQUE**: mediante el cual se adjunta el descargo técnico (punto por punto) sobre las observaciones referidas en el documento de referencia **b)**.
2. **INFORME DE EVALUACIÓN TECNICA DE AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 001- NEMAEC-LACC**: mediante el cual se sustenta la ampliación de plazo de 15 días calendario solicitada por la empresa Contratista. Se adjunta la ADENDA 01 al CONTRATO N°001-2026-NEMAEC, debidamente firmada por las partes.
3. **INFORME TECNICO N°018-2026-NEMAEC-LACC-CPNP_COLLIQUE**: mediante el cual se remite el expediente de modificación de la Ficha Técnica (Deductivo - Vinculante), que incluye el cronograma final de intervención (acelerado).

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

**MIGUEL IVAN ALARCÓN PARCO**
**PRESIDENTE NEMAEC**

FONCODES Firma Digital
Firmado digitalmente por QUISPE GALARZA Ronald Rodrigo FAU 20509139700 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11.03.2026 11:36:23 -05:00

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"*
*"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"*

San Isidro, 11 de Marzo del 2026

# OFICIO N° 000103-2026-MIDIS/FONCODES/UGPE

**Señor**
**MIGUEL IVÁN ALARCÓN PARCO**
**Presidente del NE para el Mantenimiento, Acondicionamiento y equipamiento de Comisarías (NEMAEC)**
Presente. -

Asunto : Requerimiento de informe y documentación técnica respecto a observaciones advertidas en la intervención de mantenimiento de la CPNP Collique-Comas.

Referencia : a) Informe N.° 024-2026-FONCODES/UGPE/SUP-JLPM
b) Oficio N° 000095-2026-MIDIS/FONCODES/UGPE
c) Norma Técnica N° 05-2025-FONCODES/UGPE

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia a), mediante el cual la Supervisión de la UGPE informa sobre las observaciones advertidas durante la visita técnica inopinada realizada el 10 de marzo de 2026 a la intervención correspondiente al "Servicio de Mantenimiento y Acondicionamiento de la Infraestructura de la CPNP Collique-Comas".

Al respecto, conforme se desprende del citado informe, durante la verificación técnica efectuada se ha evidenciado la existencia de trabajos inconclusos y deficiencias técnicas constructivas en la infraestructura intervenida, entre ellas la no ejecución de la reubicación del tanque elevado con su correspondiente estructura metálica, deficiencias en la presión de agua en los servicios higiénicos del segundo nivel, desprendimiento de pintura en diversos ambientes, deficiencias en la instalación de inodoros, falta de resanes, trabajos pendientes en instalaciones eléctricas, pintura y limpieza general, así como la falta de limpieza en la fachada principal de la comisaría.

Asimismo, se advierte que, a la fecha de la visita, no se habría remitido a esta Unidad documentación técnica que sustente formalmente la continuidad de la ejecución, pese a encontrarse el servicio con plazo vencido, ni tampoco documentación que respalde la procedencia de modificaciones contractuales durante la ejecución de la intervención.

Sobre el particular, corresponde recordar que el numeral 5.2.3.3 de la Norma Técnica N° 05-2025-FONCODES/UGPE (literal d.) establece que el Núcleo Ejecutor gestiona las modificaciones que resulten necesarias durante la ejecución, las cuales deben estar debidamente sustentadas en un informe técnico y contar con la aprobación previa de la UGPE antes de su implementación. Del mismo modo, mediante el Oficio N° 000095-2026-MIDIS/FONCODES/UGPE se remitió al Núcleo Ejecutor el "Procedimiento para la gestión y aprobación de modificaciones durante la ejecución de intervenciones de mantenimiento y acondicionamiento de comisarías bajo el sistema de contratación a



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Fondo de Cooperacion para el Desarrollo Social, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **http://www.foncodes.gob.pe/sgd/verifica** e ingresando el siguiente código de verificación: **NGJOVPB**

suma alzada", el cual dispone expresamente que no se reconocen mayores metrados, no procede la compensación informal entre partidas y no pueden ejecutarse partidas no contempladas ni modificaciones sin autorización formal previa de la UGPE, bajo responsabilidad.

En ese sentido, se requiere al Núcleo Ejecutor que, en el plazo máximo de tres (03) días hábiles de notificado el presente, remita a esta Unidad:

1. Un informe situacional detallado sobre el estado actual de la ejecución de la intervención en la CPNP Collique-Comas, precisando el avance real de las partidas contractuales, las razones que explican las observaciones advertidas y las acciones adoptadas para su levantamiento integral.
2. La documentación que sustente la continuidad de la ejecución pese al vencimiento del plazo contractual.
3. De corresponder, el expediente de modificación respectivo, debidamente organizado y suscrito, indicando expresamente el tipo de modificación aplicable conforme al procedimiento aprobado.
4. El cronograma de levantamiento de observaciones.

Asimismo, se le comunica que, mientras no se cuente con el levantamiento de las observaciones advertidas y, de ser el caso, con el sustento técnico y aprobación formal de las modificaciones que correspondan, no deberá promoverse ni comunicarse programación de entrega, culminación, conformidad de recepción ni actividades de inauguración de la intervención materia del presente

Hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,
Documento firmado digitalmente
……..
**RONALD RODRIGO QUISPE GALARZA**
Jefe de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales
**FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL**



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Fondo de Cooperacion para el Desarrollo Social, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **http://www.foncodes.gob.pe/sgd/verifica** e ingresando el siguiente código de verificación: **NGJOVPB**

# NÚCLEO EJECUTOR PARA EL MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE COMISARÍAS - NEMAEC

## CONVENIO N°005-2025-FONCODES

*"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"*

## ADENDA N° 01 AL CONTRATO N° 001-2026-NEMAEC

Conste por el presente documento la **ADENDA N°01** al **CONTRATO N°001-2026-NEMAEC**, en adelante, el "CONTRATO", que celebran de una parte el NÚCLEO EJECUTOR PARA EL MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE COMISARÍAS – NEMAEC, con RUC N°20614998033, con domicilio legal en Calle Manco Segundo Nº2621, distrito de Lince, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su Presidente señor **MIGUEL IVÁN ALARCÓN PARCO**, identificado con DNI N°40382546, a quien en adelante se denominará "LA ENTIDAD CONTRATANTE"; y por la otra parte, la empresa ANDEAN TRADING COMPANY SAC, con RUC N°20509152129, con domicilio legal en PJ. VELARDE NRO. 165 DPTO. 104 (ESPALDA CDRA. 12 DE AV. WILSON), Distrito de Lima, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representado por su Gerente General Sra. JESUS DINA REYES GONZALES, identificada con DNI N°10040323, según poder inscrito en la partida electrónica N°11666858, Asiento C00001 de la Zona Registral N°IX Oficina Registral de Lima del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Lima, a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA"; en los términos siguientes:

MIGUEL IVAN ALARCON PARCO
PRESIDENTE
NEMAEC

**CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES**

Con fecha 13 de enero de 2026, LA ENTIDAD CONTRATANTE y EL CONTRATISTA suscribieron el Contrato N°001-2026-NEMAEC, cuyo objeto es la contratación del Servicio de Mantenimiento y Acondicionamiento de la Infraestructura de la CPNP Collique – Comas, conforme a los términos de referencia, fichas técnicas y demás documentos contractuales, pactándose inicialmente un plazo de ejecución de cuarenta y cinco (45) días calendarios, contados desde el día siguiente de la suscripción del contrato.

Mediante carta de fecha 27 de febrero de 2026, "EL CONTRATISTA", a través de su representante legal, solicitó una ampliación del plazo de ejecución del referido contrato por un periodo de dieciocho (18) días calendario adicionales, adjuntando el sustento técnico correspondiente para la ejecución del proyecto "Servicio de Mantenimiento y Acondicionamiento de la infraestructura de la CPNP Collique – Comas".

Mediante INFORME DE EVALUACIÓN TECNICA DE AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 001-NEMAEC-LACC, de fecha 27 de febrero del 2026, luego de la evaluación técnica respectiva, recomienda formalizar la ampliación del plazo de ejecución del contrato en 15 días calendarios adicionales, a fin de garantizar la adecuada culminación de las actividades programadas, conforme a los términos de referencia y las necesidades operativas de la intervención

ANDEAN TRADING COMPANY S.A.C.
JESUS DINA REYES GONZALES
Gerente General

**CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA PRESENTE ADENDA**

Debido a que el sustento del retraso es justificado y no es imputable a "EL CONTRATISTA", las partes acuerdan, AMPLIAR el plazo de vigencia del "CONTRATO" por un periodo de **quince (15) días calendarios**.

**CLÁUSULA TERCERA: RATIFICACIÓN**

Las partes ratifican que las demás cláusulas, términos y condiciones del documento original del "CONTRATO" que no hayan sido modificadas expresamente por este documento mantienen su plena vigencia y efecto legal.

**CLÁUSULA CUARTA: CONFORMIDAD**

En señal de conformidad, las partes firman la presente adenda por duplicado, a los 27 días del mes de febrero de 2026.

MIGUEL IVAN ALARCON PARCO
PRESIDENTE
NEMAEC

"LA ENTIDAD CONTRATANTE"
**Sr. MIGUEL IVÁN ALARCÓN PARCO**
Presidente – NEMAEC

ANDEAN TRADING COMPANY S.A.C.
JESUS DINA REYES GONZALES
Gerente General

"EL CONTRATISTA"
**Sra. JESUS DINA REYES GONZALES**
Gerente General – ANDEAN TRADING COMPANY SAC

# INFORME N° 024–2026–FONCODES/UGPE/SUP–JLPM

| | | |
|---|---|---|
| **A** | : | **Ronald Rodrigo Quispe Galarza**<br>Jefe de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales - FONCODES |
| **De** | : | **José Luis Pariona Martínez**<br>Supervisor de Mantenimiento |
| **Asunto** | : | Estado Situacional de la Ejecución de la CPNP Collique–Comas. |
| **Fecha** | : | Lince, 10 de marzo de 2026 |

---

Me es grato dirigirme a usted, en cumplimiento y atención a los documentos de la referencia; para informarle y poner en conocimiento el estado actual en el que se encuentran los aplicativos informáticos puestos a disposición del NEMAEC a la fecha actual y que se expone a continuación:

## I. ANTECEDENTES

1.1. Con fecha 12 de diciembre de 2025, la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales - UGPE de FONCODES, remitió al NEMAEC, mediante OFICIO N° 00337-2025-MIDIS/FONCODES/UGPE la Ficha Técnica aprobada de la CPNP Collique Comas, para el acondicionamiento de la Comisaría PNP Collique-Comas, de conformidad con la opinión técnica favorable contenida en el Informe N° 033-2025-TBCR. La citada Ficha Técnica ha sido elaborada para el mantenimiento y acondicionamiento integral de la CPNP Collique, considerando los plazos de ejecución y comprendiendo las metas, metrados, criterios de intervención y presupuesto requerido para optimizar la capacidad operativa de dicha dependencia policial, en concordancia con el objeto de la intervención previsto en Convenio N1005-2025-FONCODES, según la Norma Técnica N°05-2025-FONCODES/UGPE y lo establecido en el Art. 16 de la Ley 32416.

1.2. Mediante Carta N°029-2026-NEMAEC/PRESIDENCIA de 14 de enero de 2026 el NEMAEC remitió la conformidad de recepción y validación de Fichas Técnicas, adjuntando entre ellas el INFORME TÉCNICO Nº05-2025-NEMAEC-SVAT de 29 de diciembre de 2026 correspondiente a la revisión y validación de la Ficha Técnica CPNP Collique – Comas.

1.3. Mediante Contrato N° 001–2026–NEMAEC, suscrito el 13 de enero de 2026 entre el Núcleo Ejecutor para el Mantenimiento, Acondicionamiento y Equipamiento de Comisarías–NEMAEC y la empresa ANDEAN TRADING COMPANY S.A.C. para la ejecución del “Servicio de Mantenimiento y Acondicionamiento de la Infraestructura de la CPNP Collique–Comas”, documento a través del cual han quedado establecidas las partidas, metrados, especificaciones técnicas y presupuesto correspondiente para la intervención de la infraestructura policial.

1.4. Mediante el oficio N°000095-2026-MIDIS/FONCODES/UGPE, de fecha 27 de febrero del 2026 la UGPE remitió el procedimiento para la gestión y aprobación de modificaciones durante la ejecución de intervenciones de mantenimiento y acondicionamiento de comisarías bajo el sistema de contratación a suma alzada, ejecutadas mediante núcleo ejecutor (NEMAEC), para su disposición y aplicación.

1.5. La UGPE efectúa la supervisión técnica y administrativa de la ejecución, realizando el seguimiento del cumplimiento de los compromisos contractuales, brindando asistencia técnica al Núcleo Ejecutor y emitiendo observaciones y recomendaciones cuando corresponda, las cuales deben ser atendidas en los plazos establecidos; motivo por el cual se realizan visitas técnicas inopinadas a las infraestructuras policiales intervenidas con la finalidad de verificar el avance físico, cumplimiento de las especificaciones técnicas en concordancia con lo establecido en la Ficha Técnica aprobada.

## II. BASE LEGAL

2.1. NORMA TECNICA N°05-2025-FONCODES/UGPE para le Ejecución de Intervenciones de Mantenimiento y Acondicionamiento de la Infraestructura de Comisarías mediante Núcleos Ejecutores, aprobada con RDE N° 00185-2025-MIDIS/FONCODES/DE, de fecha 19 de noviembre del 2025

2.2. CONVENIO N°005-2025-FONCODES de 29 de octubre del 2025, convenio de financiamiento entre el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES) y el Núcleo Ejecutor para el Mantenimiento, Acondicionamiento y Equipamiento de Comisarias (NEMAEC).

2.3. Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).

2.4. Norma G.050 Seguridad durante la construcción.

2.5. Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2.6. Términos de Referencia que regulan las obligaciones técnicas del contratista.

## III. ANALISIS

De acuerdo con el seguimiento y monitoreo de la Supervisión de la UGPE, que constituye un proceso continuo de acompañamiento a la gestión administrativa, financiera y técnica del Núcleo Ejecutor, se ha verificado lo siguiente:

- El día 10 de marzo del 2026, se realizó una visita técnica inopinada por parte de la Supervisión de la UGPE, Abog. Rodrigo Ronald Quispe Galarza - Jefe de la UGPE, Ing. José Luis Pariona Martínez – Supervisor de Mantenimiento, el Sr. Karl Rondoño Grados – Tesorero del NEMAEC y encontrando por parte del contratista al Ing. Clever García Salazar – SSOMA del mantenimiento; sin contar hasta ese momento con la presencia del Residente del Mantenimiento.

- Durante la visita de inspección técnica efectuada a la ejecución del "Servicio de Mantenimiento y Acondicionamiento de la Infraestructura de la CPNP Collique–Comas", se ha verificado que la empresa ejecutora viene realizando trabajos que corresponden a la culminación del servicio (limpieza general, pintura en general, resanes, etc), evidenciándose la ejecución de algunas partidas no concluidas siguientes:
  - No se ha realizado la reubicación del tanque elevado con la correspondiente estructura metálica, lo que podría indicar la existencia de deductivos ejecutados no vinculados.
  - Se ha verificado que la dotación de agua en los SS.HH. del segundo nivel funcionan deficientemente debido a la baja presión de agua existente en los puntos de consumo (lavatorios, inodoros y duchas), que idealmente debe superar los 2 metros sobre el punto de consumo más alto que requiere el tanque elevado.
  - Desprendimientos de pintura en varios ambientes de la infraestructura policial intervenida (dormitorios, pasadizos, muros perimetrales, etc), por falta de adherencia causada por humedad, preparación deficiente (suciedad/polvo), o incompatibilidad entre capas de pintura.
  - Falta de fijación o ajuste firme de los tanques a las tazas de los inodoros mediante los pernos de unión previo sellado con empaque para evitar fugas de agua.
  - Falta de resanes de revoques, enlucidos y molduras en muros, escaleras y paredes.
  - Falta de trabajos de instalaciones eléctricas, pintura en general y limpieza general en toda la infraestructura intervenida.
  - No se ha realizado ningún tipo de limpieza en la fachada principal de la comisaría (paredes con enchape de cerámicos)

- Por otro lado, cabe señalar que, a la fecha de la presente evaluación, no se ha remitido a esta instancia documentación técnica que sustente formalmente la continuidad de la de ejecución ya que a la fecha se encuentra con plazo vencido; además de no contar con documentos que sustenten la ejecución de modificaciones y/o adicionales, tales como ampliaciones de plazo, informes técnicos, aprobaciones del proyectista o autorizaciones de la entidad competente que debe contar previamente con sustento técnico y aprobación formal de la entidad con opinión favorable del proyectista.

## IV. CONCLUSIONES

4.1 Durante la visita técnica inopinada realizada por la supervisión de la UGPE se encontraron observaciones en la "Servicio de Mantenimiento y Acondicionamiento de la Infraestructura de la CPNP Collique–Comas", las cuales, se verifican en panel fotográfico adjunto al presente documento.

4.2 Durante la verificación técnica realizada en la CPNP COLLIQUE, se ha evidenciado la ejecución de trabajos inconclusos y con deficiencias técnicas constructivas.

4.3 A la fecha, no se cuenta con documentación técnica que sustente ni autorice la continuidad en la ejecución de partidas; así como también

la ejecución de modificaciones y/o adicionales, lo cual, dificulta la validación técnica de las intervenciones ejecutadas.

4.4 La ejecución de trabajos sin sustento técnico ni aprobación formal podría generar observaciones técnicas, administrativas y de control, además de riesgos asociados a la operatividad y funcionabilidad de toda la infraestructura intervenida.

## V. RECOMENDACIONES

5.1 Solicitar al núcleo ejecutor NEMAEC la remisión inmediata con carácter de urgencia la documentación técnica que sustente los trabajos no ejecutados y no previstos en la Ficha Técnica, incluyendo procedimientos, planos modificados, metrados y presupuesto correspondiente.

5.2 Se recomienda solicitar al NEMAEC - responsable de la ejecución del mantenimiento, el levantamiento de las observaciones detectadas en la visita de Supervisión antes de poder realizar y/o comunicar cualquier programación de entrega, culminación, conformidad de recepción y/o actividades de inauguración.

5.3 Por otra parte exhortar al monitor encargado realizar las labores de monitoreo con bastante diligencia en función a sus competencias y responsabilidades asignadas para garantizar la calidad, operatividad, funcionabilidad, durabilidad y seguridad de la infraestructura intervenida.

5.4 En consecuencia, es todo lo que tengo que hacer de su conocimiento para los fines correspondientes, salvo mejor parecer.

Atentamente,

.....

**JOSÉ LUIS PARIONA MARTÍNEZ**
**Supervisor de Mantenimiento**

**Imagen N° 01**
**Deficiencia Constructiva en la Ubicación y altura de tanque elevado**

Se verifica que no hubo reubicación del tanque elevado; así mismo la salida de agua del tanque elevado para el suministro de agua con respecto al segundo nivel es de aproximadamente h= 1.30 m. lo cual es insuficiente para el correcto funcionamiento de los aparatos sanitarios y duchas de los SS.HH. construidos en este nivel.

**Imagen N° 02**
**Deficiencia Constructiva en la instalación de los Inodoros**

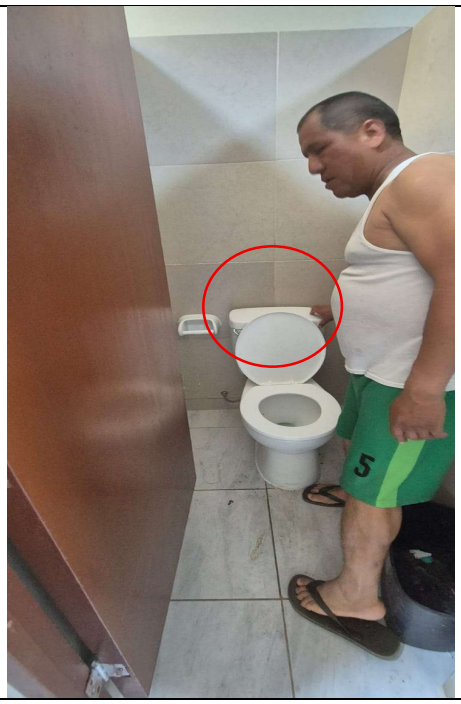

Se verifica la falta la fijación y aseguramiento de los tanques en las tazas de los SS.HH.

**Imagen N° 03**
**Deficiencia Constructiva en la Ubicación y altura de tanque elevado**

Se verifica el desprendimiento de pintura en paredes y cielo raso de ambientes de comisaría por deficiencias constructivas.

**Imagen N° 04**
**Falta de Culminación de partidas**

Se verifica que no se culminó con todas las partidas de instalaciones eléctricas. Así mismo faltan concluir con los resanes en escaleras, muros, vigas y columnas etc.
