INFORME TÉCNICO Nº 011-2026-NEMAEC-LACC

A	:	**MIGUEL IVÁN ALARCÓN PARCO** Presidente del NEMAEC
DE	:	**LUIS ALBERTO CALLUPE CASTILLO** Monitor de obra del NEMAEC
ASUNTO	:	**Informe de Entrega de Terreno e Inicio de Actividades en la CPNP Carabayllo y Alerta de Incumplimiento por Ausencia de Personal Clave en la CPNP Ensenada**
REFERENCIA	:	Contrato N° 015-2026-NEMAEC_LA ENSENADA / CARABAYLLO
FECHA	:	Lince, 31 de enero de 2026

---

1. ANTECEDENTES

1.1. Del Marco Normativo: El presente informe se emite en ejercicio de las facultades de monitoreo y supervisión, conforme a la **Norma Técnica N° 05-2025-Foncodes/UGPE** y la **Ley N° 32416**, que autoriza la ejecución de intervenciones de mantenimiento en comisarías a través de Núcleos Ejecutores.

1.2. De la Adjudicación del Servicio: Mediante proceso de selección, se adjudicó el mantenimiento de un paquete de dos (02) locales policiales: **CPNP La Ensenada y CPNP Carabayllo**, formalizándose a través del **Contrato N° 015-2026-NEMAEC**, suscrito con el **CONSORCIO ENSENADA.**

1.3. De la Indivisibilidad del Plazo Contractual: Es preciso señalar que, según las bases y el contrato mencionado, el servicio cuenta con un **plazo de ejecución único de cuarenta y cinco (45) días calendario** para ser ejecutados en paralelo. El cómputo de este plazo es vinculante para ambas sedes y se inicia formalmente con el acto de entrega de terreno.

1.4. De la Obligatoriedad del Personal Clave: Conforme a los Términos de Referencia (TDR) y la normativa de FONCODES, la presencia del Residente de Servicio acreditado en el acto de entrega de terreno es una condición obligatoria e insubsanable para el inicio de actividades. Su ausencia impide la apertura del Cuaderno de Incidencias y la validación

técnica del inicio de obra.

2. GENERALES DEL PROYECTO

2.1. Denominación del Servicio: Mantenimiento y Acondicionamiento de la infraestructura de la CPNP La Ensenada y CPNP Carabayllo.

2.2. Contratista: CONSORCIO ENSENADA.

2.3. Monto Contractual Total: S/ 698,843.68 (Seiscientos noventa y ocho mil ochocientos cuarenta y tres con 68/100 soles), incluido IGV.

2.4. Plazo de Ejecución: Cuarenta y cinco (45) días calendario.

2.5. Sistema de Contratación: Suma Alzada.

2.6. Fecha de Firma de Contrato: 29 de enero de 2026.

2.7. Fecha de Inicio Contractual (Día 1): 30 de enero de 2026 (Conforme a la cláusula contractual que estipula el inicio del plazo al día siguiente de la suscripción del contrato 015-2026-NEMAEC).

2.8. Fecha de Término Programada: 15 de marzo de 2026.

2.9. Ubicación de las Intervenciones:

- **Sede A:** CPNP La Ensenada (Av. Las Acacias con Calle Jacarandá, Puente Piedra).
- **Sede B:** CPNP Carabayllo (Distrito de Carabayllo).

3. ACTIVIDADES DE CONTROL REALIZADAS (DÍA 01: 30 de enero del 2026)

3.1. CPNP CARABAYLLO (Inicio Conforme):

- **Entrega de Terreno e Inicio:** Se realizó la verificación de la libre disponibilidad del área de intervención. Al contar con la presencia del Residente de Obra acreditado y el Comisario de la dependencia, se procedió a la suscripción del Acta de Entrega de Terreno e Inicio de Obra.

- **Control de Personal:** Se verificó en campo la identidad y acreditación del Residente de Obra, cumpliendo con los requisitos del TDR.
- **Apertura de Registro:** Ante la falta del Cuaderno de Incidencias físico por parte del contratista, esta monitoria procedió a emitir el Asiento N° 02 en formato impreso y firmado, garantizando la trazabilidad de las instrucciones técnicas iniciales y salvaguardando la responsabilidad del NEMAEC.
- **Verificación Técnica:** Se realizó el replanteo conjunto con el Ing. Luis Huaman (Infraestructura PNP), detectándose que, por falta de espacio físico, no se ejecutarán las camas de concreto ni el SSHH para discapacitados en los términos de la ficha, procediendo a la optimización de un (01) SSHH en el primer piso con rampa de acceso.

3.2. CPNP LA ENSENADA (Inicio Suspendido por Incumplimiento):

- **Inasistencia de Personal Clave:** Durante el acto programado, se constató la ausencia del Residente de Obra acreditado, del Maestro de Obra y del Prevencionista de Riesgos. Solo se contó con la presencia del Gerente General del Consorcio, quien carece de las facultades técnicas contractuales para dirigir la ejecución y suscribir el cuaderno de incidencias.
- **Suspensión del Acto:** En estricto cumplimiento de la normativa de FONCODES, se procedió a la SUSPENSIÓN de la Entrega de Terreno. Se notificó al contratista que no puede dar inicio a ninguna actividad física sin el profesional responsable en campo.
- **Acciones de Mitigación:** A pesar de la suspensión, esta monitoria realizó una verificación preliminar de metas (redes y muros con salitre) con fines informativos, dejando claro en presencia del Gerente General que dicha actividad NO constituye un inicio de obra ni convalida la ausencia del personal clave.
- **Estado de Alerta:** Se envió un comunicado inmediato al Coordinador General del NEMAEC informando que el inicio en esta sede queda supeditado a la subsanación de la acreditación del residente.

4. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

Se realizó la supervisión de los protocolos de seguridad bajo los lineamientos de la **Ley N° 29783** y la **Norma G.050**, reportándose lo siguiente:

4.1. CPNP LA ENSENADA:

- **Imposibilidad de Control:** Debido a la ausencia del Residente de Servicio y del Prevencionista de Riesgos (PDR), no se pudo realizar la validación de los protocolos de seguridad.
- **Restricción de Acceso:** Se dejó constancia ante el Gerente General del Consorcio que, bajo ninguna circunstancia, se permitirá el ingreso de personal operativo ni el inicio de demoliciones sin la presencia del PDR y la entrega física de las pólizas SCTR (Salud y Pensión) vigentes.

4.2. CPNP CARABAYLLO:

- **Documentación Pendiente:** Se verificó la ejecución de la charla de 5 minutos y el llenado del ATS; sin embargo, el contratista tiene pendiente la entrega formal del **Plan de Trabajo y el Plan de SST**.
- **Control de Seguros (SCTR):** Se otorgó un plazo perentorio hasta el día **31/01/2026** para la presentación del SCTR de todo el personal. Se notificó al Residente que **sin SCTR activo no se autoriza el inicio de labores de alto riesgo** (trabajos en altura o instalaciones eléctricas).
- **Inspección de EPP:** Se observó que el Residente de Servicio no portaba el equipo de protección personal (EPP) completo al momento de la visita. Se ha dispuesto el uso obligatorio de EPP mediante checklist diario, bajo apercibimiento de anotar la falta en el registro de incidencias.

5. REGISTRO DE PENALIDADES E INCUMPLIMIENTOS

En el marco de la Cláusula Décima del Contrato N° 015-2026-NEMAEC, se reporta el estado de cumplimiento y las alertas preventivas generadas:

5.1. CPNP LA ENSENADA (Incumplimiento de Personal Clave):

- Estado de Penalidad: Se ha verificado el incumplimiento de la obligación de contar con el Residente de Servicio acreditado en el inicio de actividades. Según la normativa, la ausencia del profesional clave genera una penalidad diaria. Este hecho ha sido reportado a la Coordinación General del NEMAEC para la cuantificación y gestión del descuento correspondiente.

- **Alerta Preventiva:** Se notificó formalmente al Gerente General del Consorcio que cualquier solicitud de cambio de residente debe ser tramitada de inmediato ante la **Presidencia del NEMAEC**. Se enfatizó que el plazo de 45 días calendario ya se encuentra en marcha desde **el 30/01/2026**, y el retraso acumulado por falta de personal es responsabilidad íntegra del contratista.

5.2. CPNP CARABAYLLO (Alertas de Control):

- **Estado:** A la fecha no se registran penalidades aplicadas, pero se mantienen condiciones críticas de control.
- **Alerta Preventiva por Cuaderno de Incidencias:** Se notificó al Residente que la falta de entrega del Cuaderno de Incidencias físico (Día 02) activará la penalidad por Incumplimiento de Obligaciones Contractuales (equivalente al 3% del monto total).
- **Alerta por Cronograma:** Se conminó a la entrega del Cronograma Sincerado de actividades en un plazo de 24 horas. El incumplimiento de este documento técnico es pasible de una penalidad del 10% del monto total, según lo estipulado en la Cláusula Décima del contrato 015-2026-NEMAEC.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. CONCLUSIONES:

- **CPNP CARABAYLLO:** Se da por **INICIADA** la ejecución del servicio con fecha **30 de enero de 2026**, habiéndose suscrito el acta correspondiente con el personal clave acreditado. No obstante, se mantienen alertas por falta de entrega de documentos técnicos (Planes y Cronogramas).
- **CPNP LA ENSENADA:** El inicio de actividades físicas se encuentra **SUSPENDIDO** debido al incumplimiento contractual del contratista al no presentar al Residente de Servicio acreditado. Se recalca que el plazo de 45 días **ya está en cómputo** desde el 30/01/2026.
- **RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL:** Al ser un contrato de paquete único, el retraso en la sede Ensenada afecta la ruta crítica de todo el servicio, exponiendo al contratista a penalidades acumulativas y posibles resoluciones parciales de contrato.

6.2. RECOMENDACIONES:

- **Al Presidente/Coordinador del NEMAEC:** Evaluar la continuidad del contratista en la sede Ensenada y proceder con el cálculo de penalidades diarias por ausencia de personal clave desde el día 30/01/2026.
- **Al Contratista:** Gestionar de forma inmediata la acreditación de un nuevo residente (si fuera el caso) y regularizar la entrega de pólizas SCTR y planes de seguridad, bajo apercibimiento de paralización total de actividades en ambas sedes.
- **Al Equipo Técnico:** No permitir ningún avance físico en Ensenada hasta que el NEMAEC valide formalmente al profesional responsable en campo.

7. ANEXOS Y EVIDENCIA DIGITAL

Como sustento de las actividades descritas, se adjunta el panel fotográfico y los documentos escaneados en el siguiente orden:

- Actas de Entrega e Inicio firmadas.
- Fotos de verificación de planos en obra.
- Registro de Asiento N° 02 impreso.

ING. LUIS ALBERTO CALLUPE CASTILLO

Monitor de obra de Mantenimiento y Acondicionamiento - NEMAEC

NÚCLEO EJECUTOR PARA EL MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE COMISARÍAS - NEMAEC
CONVENIO N°005-2025-FONCODES

ACTA DE ENTREGA DE TERRENO E INICIO DE OBRA

PROYECTO: Mantenimiento, Acondicionamiento y Equipamiento de Comisarias

CONVENIO: N° 005-2025-FONCODES (NEMAEC)

COMISARIA: CARABAYLLO

UBICACIÓN: Jr. MIGUEL GRAU 285- CARABAYLLO-LIMA.

CONTRATO N°: 015-2026-NEMAEC

PLAZO DE EJECUCION: 45 días calendarios.

En la ciudad de Lima, siendo las 14 00, del día 30 de ENERO del 2026, se reunieron en las instalaciones de la **CPNP** CARABAYLLO, los representantes del Núcleo Ejecutor (NEMAEC), la Policía Nacional del Perú y la contratista CONSORCIO ENSENADA, con el fin de proceder a la entrega formal del terreno para el inicio de los trabajos. Los asistentes son las siguientes personas:

- **Por el NEMAEC:** ING. LUIS CALLUPE C.
- **Por la CONTRATISTA:** Ing. ABRAHAM A. SANTOS CHUPEROS
- **Por la CONTRATISTA:** ROBERT R. SOBRADO CHÁVEZ
- **Por la PNP Beneficiaria:** CMDTE. PNP PAUL ARANIBAR ZAMBRANO

1. OBJETO DE LA REUNION

Realizar la entrega formal del terreno (áreas a intervenir) y dar inicio oficial al plazo de ejecución del servicio de mantenimiento, de acuerdo con los Términos de Referencia y el presupuesto aprobado.

2. VERIFICACIÓN DEL TERRENO Y COMPROMISOS

Se deja constancia de lo siguiente:

- El **NEMAEC** y la **PNP,** hace entrega de las áreas libres de obstáculos que impidan el inicio de los trabajos.
- La **CONTRATISTA** declara haber inspeccionado el área y confirma que es compatible con las Fichas Técnicas y el presupuesto del servicio.
- Se cuenta con la disponibilidad de los puntos de agua y luz necesarios para la ejecución.

Escaneado con CamScanner

- **Seguridad y Salud (G.050):** La contratista asume la responsabilidad total de la custodia de materiales y la seguridad de los trabajadores y terceros dentro del área entregada.
- **Operatividad Policial:** La contratista se compromete a no interrumpir los servicios críticos de la comisaría, coordinando con el Monitor y el Comisario cualquier corte temporal de servicios (luz/agua).

3. INICIO DE PLAZO

En cumplimiento de las condiciones contractuales, se determina que el plazo de ejecución es de 45 **días calendario,** que inicia oficialmente a partir del día siguiente de la firma de la presente acta, siendo la fecha estimada de término el día 15 de MARZO **del 2026.**

4. APERTURA DE CUADERNO DE OBRA

En este mismo acto, se procede a la apertura del **Cuaderno de Obra**, el cual consta de _____ folios debidamente legalizados y sellados, quedando bajo custodia del Residente de Servicio en la sede de la comisaría.

Se firma la presente en señal de conformidad, procediendo a asentar el **Asiento N° 01** en el Cuaderno de Obra adjuntando copia de la presente acta

NEMAEC: ING. LUIS CALLUPE
MONITOR DE OBRAS

CONTRATISTA: ING. RESIDENTE
ABRAHAM SANTOS CHUMPITAZ

PNP: OA-289919
Paul ARANIBAR ZAMBRANO
Comandante PNP
Comisario CPNP - Carabayllo

ROBERT ROGER SOBRADO CHÁVEZ

Escaneado con CamScanner

NÚCLEO EJECUTOR PARA EL MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE COMISARÍAS - NEMAEC
CONVENIO N°005-2025-FONCODES

ASIENTO N° 02: DEL MONITOR NEMAEC

FECHA: 30/01/2026

ESTADO: INSTRUCCIONES DE INICIO Y CONTROL DE CALIDAD

MONITOR: ING. LUIS CALLUPE.

En mi calidad de **Monitor del NEMAEC**, tras el acto de entrega de terreno realizado el día de hoy, se imparten las siguientes instrucciones de cumplimiento obligatorio para la Contratista:

1. **PLAN DE TRABAJO Y SST:** Se otorga un plazo de 24 horas para la presentación del Plan de Trabajo detallado y el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), bajo cumplimiento de la **Norma G.050**. Se prohíbe el inicio de actividades de demolición o desmontaje sin la correcta segregación de áreas que garantice la operatividad de la CPNP CARABAYLLO
2. **ACTUALIZACIÓN DE CRONOGRAMA (TDR 10.3):** Se ordena presentar en un plazo de 48 horas el Cronograma Sincerado (CPM). Este deberá considerar los rendimientos reales de campo, la sectorización de ambientes para no afectar el servicio policial y marcar hitos obligatorios para Pruebas de Megado e Hidráulicas.
3. **GESTIÓN DE CALIDAD Y MATERIALES:** Toda partida ejecutada sin el Protocolo de Liberación firmado por esta Monitoria no será reconocida para valorización. Se exige la entrega de certificados de calidad de los conductores NH-90, tableros y accesorios sanitarios previo a su instalación.
4. **COMPATIBILIDAD:** El Residente deberá presentar el Informe de Compatibilidad en un plazo de 5 días, detallando cualquier discrepancia en metrados o vicios ocultos detectados en la infraestructura existente.

Se cierra el presente asiento dejando constancia de la plena conformidad del inicio de actividades.

NEMAEC: ING. LUIS CALLUPE
MONITOR DE OBRAS
NEMAEC.

RESIDENTE DE SERVICIO:
ING. ABRAM SANTOS CUELLAR
CIP 87321

Escaneado con CamScanner

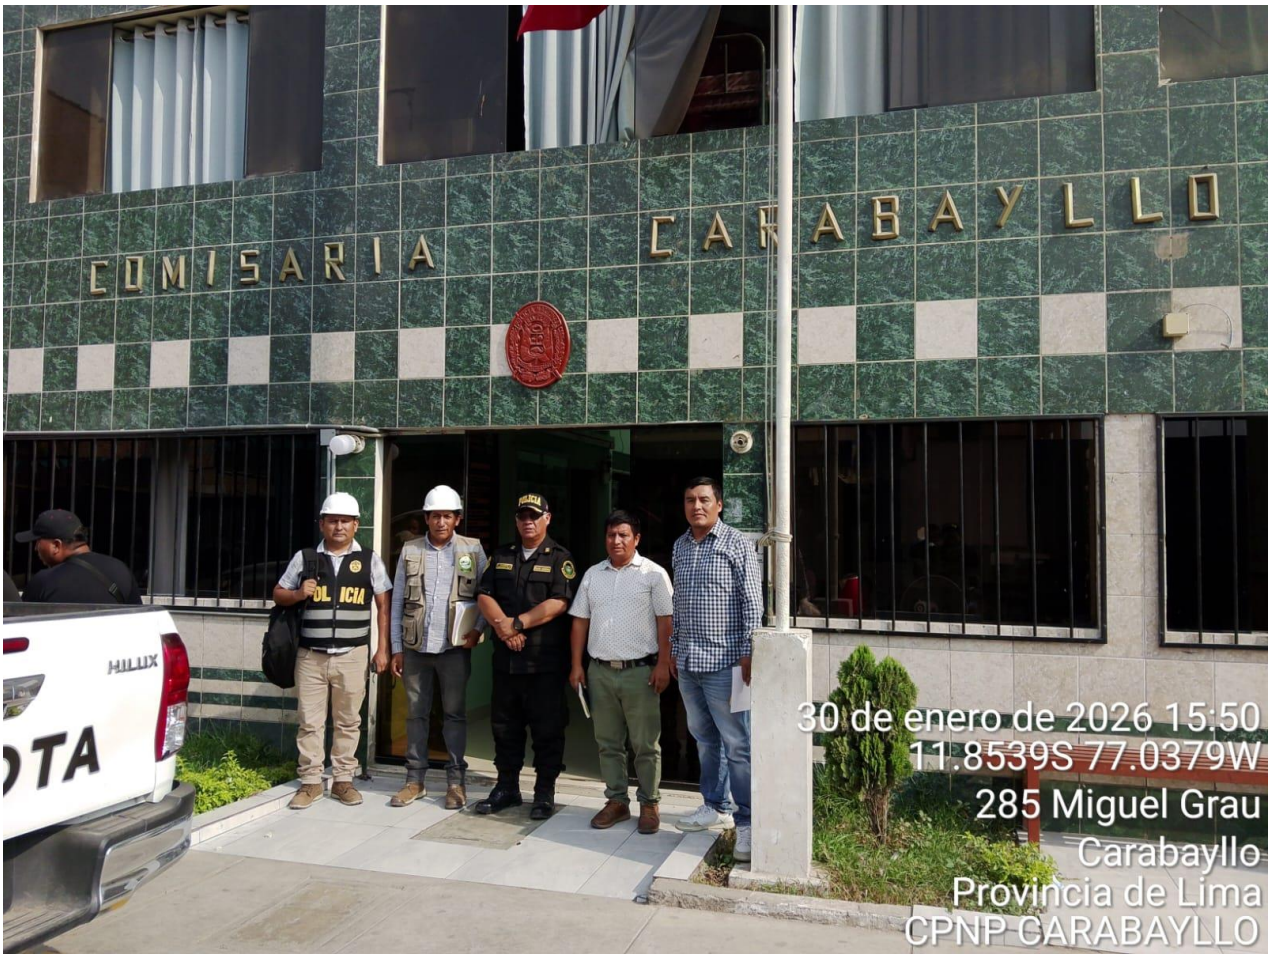
COMISARIA
CARABAYLLO
HILUX
30 de enero de 2026 15:50
11.8539S 77.0379W
285 Miguel Grau
Carabayllo
Provincia de Lima
CPNP CARABAYLLO
