CONSORCIO ALONFER

NEMAEC
08 ABR. 2026
RECIBIDO
HORA: 09:34am FIRMA:

CARTA N° 06-2026/CONSORCIOALONFER

Lima, 08 de abril del 2026

Señor:
MY PNP Miguel Alarcon Parco
Presidente
NÚCLEO EJECUTOR PARA EL MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE COMISARÍAS - NEMAEC
Presente. –

Asunto : Reconsideración del plazo reconocido (25 días) - Solicitud de reconocimiento integral del plazo sustentado (30 días calendario).

Referencia :
1. *Solicitud de ampliación de plazo de fecha 10/03/2026 y anexos técnicos.*
2. *Carta N.° 000169A-2026-NEMAEC – Remisión de Adenda N.° 01 al Contrato N.° 013-2026 NEMAEC (plazo reconocido: 25 días).*
3. *Informe Técnico de Ampliación N.° 001-2026-JARC/RO-CAEIRL-CPMPJICAMARCA e Informes complementarios / Cuaderno de obra / Cronograma reprogramado.*

De nuestra consideración:

El que se suscribe, JOSE MITCHELL CHAVEZ CABALLERO, representante común del CONSORCIO ALONFER, identificado con D.N.I. N° 43518257, conformada por la empresa CONSORCIO ALONFER EIRL con RUC N° 20607342009 y JAIR HUMBERTO GONZALES CAVERO con RUC N° 10107325650, con domicilio Legal en Jr. Rodolfo Beltran Mz G Dpto. 15 – Lima, presento ante usted y expongo.

Me dirijo a usted, con la finalidad de interponer reconsideración respecto del plazo reconocido mediante la carta 000169A-2026-NEMAEC (25 días calendario), solicitando que el núcleo reconozca el plazo integral sustentado: treinta (30) días calendario, conforme a la documentación técnica presentada y a la realidad operativa acreditada en obra.

Esta solicitud se formula dentro del marco del Contrato y de la documentación que integra el expediente técnico–administrativo de la ejecución, así como evitar contingencias posteriores en la conformidad.

I. SOLICITUD

Solicitamos se sirva disponer lo siguiente:

1. *Se reconsidere el plazo reconocido y, en su lugar, se apruebe la ampliación por treinta (30) días calendario, conforme al sustento técnico y cronograma reprogramado presentados.*

2. *En cuanto la presente solicitud es de derecho, mientras se resuelve la presente reconsideración, no se compute ni ejecute penalidad por mora asociada al tramo de plazo cuya ampliación ha sido sustentada por causas no atribuibles, a fin de evitar afectación económica por un riesgo no asumido por el contratista y prevenir controversias.*

II. SUSTENTO TECNICO

El sustento presentado por el residente y la documentación complementaria acreditan, de manera coherente, que la extensión requerida no deriva de demoras que nos sean imputables, sino de condicionantes técnicas y operativas que impactaron partidas críticas y obligaron a reprogramar secuencias de ejecución. En particular:

A.- Restricciones operativas por funcionamiento continuo de la unidad policial (24/7)

La comisaría se mantuvo y se mantiene operativa sin interrupción, lo que limita la liberación masiva de frentes, obliga a trabajar por sectores y reduce la posibilidad real de ejecutar tareas simultáneas. Esta restricción alteró la productividad prevista y desplaza la ruta crítica.

B. Limitaciones para trabajos eléctricos y maniobras técnicas

Las restricciones para cortes o intervenciones necesarias impiden ejecutar partidas originalmente programadas y obligan a reprogramaciones sucesivas, especialmente en actividades de instalaciones y pruebas.

C. Deficiencias expuestas del expediente/TDR y necesidad de reprocesos para asegurar calidad

El sustento técnico describe metrados incompletos, subestimaciones (caso tratamientos de muros con eflorescencia) y procedimientos previstos que, aplicados de manera literal, no garantizan el estándar de calidad, obligando a adecuaciones técnicas y retrabajos (con incremento de tiempos de proceso).

D. Eventos imprevisibles y ejecución de partidas no previstas inicialmente

Se acreditan hechos fortuitos (filtraciones, colapsos en instalaciones sanitarias) que no formaban parte del mapeo inicial, pero cuya atención resultó indispensable para asegurar funcionalidad y entrega conforme. Esas intervenciones, por su naturaleza, impactan directamente el cronograma y desplazan hitos de cierre.

En suma: ***la ampliación sustentada (30 días)*** *responde a un impacto acumulado en secuencias técnicas que no pueden comprimirse razonablemente sin sacrificar calidad, seguridad o funcionalidad, más aún cuando existen restricciones de acceso u operaciones propias del servicio policial. En ese contexto, el reconocimiento parcial de 25 días deja un* ***déficit de cobertura*** *frente al impacto técnico acreditado.*

CONSORCIO
ALONFER

Sobre penalidades: improcedencia de trasladar el impacto económico de causales no imputables y mayores prestaciones

Debe considerarse que una eventual aplicación de penalidades por mora derivada de no reconocer el plazo íntegro sustentado (30 días) ***perjudica económicamente a la empresa*** *por un retraso que* ***no se origina en incumplimiento injustificado****, sino en causales debidamente evidenciadas y en la ejecución de prestaciones no previstas inicialmente que han sido necesarias para la entrega funcional del servicio.*

Por ello, corresponde que la evaluación del plazo sea consistente con el sustento presentado y que, mientras dure la revisión formal del plazo, se evite generar cargos económicos que ***después deban ser corregidos o controvertidos****.*

Criterio uniforme e igualdad de trato en el programa

Finalmente, solicitamos que la evaluación del plazo se realice con criterios uniformes y verificables, comparables con los utilizados en intervenciones análogas del mismo programa, en las que se han aprobado ampliaciones incluso de mayor magnitud (hasta 32 días), sin que ello haya representado un tratamiento económicamente más gravoso cuando las causales estuvieron sustentadas y no fueron atribuibles a las empresas.

Este pedido se formula para preservar la consistencia de decisiones e igualdad de trato en supuestos equivalentes, evitando asimetrías que puedan ser percibidas como diferencias no justificadas entre intervenciones con condicionantes operativas similares (comisarías en funcionamiento continuo, restricciones de frentes, TDR con inconsistencias, interferencias y eventos fortuitos).

Solicitud de tramite

Atendiendo a la naturaleza técnica del asunto, solicitamos se convoque —de considerarse pertinente— a una reunión de revisión del sustento, a fin de dejar el expediente plenamente sustentado para el cierre contractual.

Adjuntamos los documentos técnicos ya presentados y el sustento descritos.

Por lo descrito Señor Presdiente del Núcleo Ejecutor, quedo a su pronta atención.

Atentamente,

CONSORCIO ALONFER
JOSE MITCHELL CHAVEZ CABALLERO
DNI N° 43518257
Representante Comun

CONSORCIO
ALONFER

Jicamarca, 10 de marzo de 2026

Señor
MY PNP MIGUEL ALARCON PARCO
Presidente *del Núcleo*
Ejecutor Presente. -

ASUNTO : SOLICITO AMPLIACION DE PLAZO

REFERENCIA : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CPNP JICAMARCA EN EL DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.

De nuestra consideración.

Es grato dirigirme a usted, con relación al asunto de la referencia, con la finalidad de solicitar a quien corresponda, aprobar la Ampliación de Plazo de Ejecución Contractual para el SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CPNP JICAMARCA EN EL DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, toda vez que el hecho generador ha culminado y es necesario una extensión de plazo, a fin de ejecutar el servicio respectivo, por causas no atribuibles al contratista, conforme a lo establecido en el término de referencia, por lo cual es necesario ampliar el plazo de ejecución de la prestación por treinta (30) días calendario. La Ampliación de Plazo se solicita por las siguientes causales:

1. Las instalaciones de la comisaria PNP Jicamarca opera las 24 horas del día sin la interrupción de sus servicios que es una restricción para intervenir más de un *ambiente.*
2. Ejecución de partidas adicionales que han generado el retraso de ejecución de partidas programadas han modificado la ruta crítica de la programación para lo cual se tiene algunas partidas pendientes de ejecución.
3. ADICIONALES y DEDUCTIVOS VINCULANTES

Por las causales descritas Señor presidente del Núcleo Ejecutor, Solicito Ampliación de Plazo.

Asimismo, se adjunta:

- ✓ **INFORME TÉCNICO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 001-2026-JARC/RO-CAEIRL-CPNPJICAMARCA**__de acuerdo a lo establecido en la Norma Técnica N°05-2025-FONCODES/UGPE y a lo establecido en el Art. 16 de la Ley N°32416.

CONSORCIO
ALONFER

- ✓ Anexos (Copias de Cuaderno de Obra)
- ✓ INFORME N° 002-2026-JARC/RO-CPNPJICAMARCA
- ✓ INFORME N° 003-2026-JARC/RO-CPNPJICAMARCA
- ✓ Cronograma reprogramado de la Meta Contractual.
- ✓ Cronograma valorizado de obra

Sin otro particular, me suscribo de usted, reiterándole mi muestra de estima y respeto.
Atentamente,

CONSORCIO ALONFER
JOSE MITCHELL CHAVEZ CABALLERO
DNI N° 43518257
Representante Comun

NÚCLEO EJECUTOR PARA EL MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE COMISARÍAS - NEMAEC

CONVENIO N°005-2025-FONCODES

Lima, 13 de marzo de 2026

CARTA N° 000169A-2026-NEMAEC

Señor:
JOSÉ MITCHELL CHÁVEZ CABALLERO
Representante Común del Consorcio Alonfer
Jr. Rodolfo Beltrán Mz. G Dpto. 15, Lima, Lima
Presente. -

ASUNTO: REMITO ADENDA N° 01 AL CONTRATO N° 013-2026-NEMAEC

REFERENCIA Carta S/N de fecha 10/03/2026

De mi especial consideración:

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente, en atención al documento de la referencia, por el cual SOLICITA aprobación de ampliación del plazo para la ejecución del Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Equipamiento de la Comisaria Jicamarca – Lurigancho.

Sobre el particular debo indicar que, mediante Informe Técnico Nº 001-2026-NEMAEC-JELV, de fecha 11 de marzo del 2026, el Ing. John Lizarbe Valdez en su condición de Monitor de Obra, emite pronunciamiento favorable para la aprobación de ampliación de plazo por veinticinco (25) días calendario, asimismo, recomienda se suscriba la correspondiente Adenda.

En ese sentido, requerimos su presencia en las instalaciones del NEMAEC para la correspondiente suscripción de la ADENDA N° 01 AL CONTRATO N° 013-2026-NEMAEC.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para reiterarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

.....
May. S PNP MIGUEL IVAN ALARCON PARCO
Presidente del NEMAEC

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

INFORME TECNICO DE AMPLIACION° 001-2026-JARC/RO-CAEIRL-CPNPJICAMARCA

PARA : Ing. John E. Lizarbe Valdez
Monitor de Obra

DE : Ing. Jhonny Anthony Ramirez Cruz
Residente de Obra

ASUNTO : **AMPLIACION DE PLAZO N° 01 POR 30 DIAS CALENDARIOS**

REFERENCIA :**Servicio "MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMISARIA PNP JICAMARCA"**

CONTRATO N° 013-2026-NEMAEC

FECHA : Jicamarca, **martes, 10 de marzo del 2026.**

Por medio del presente tengo a bien dirigirme a usted, a fin de presentarle el INFORME TECNICO DE AMPLIACION° 001-2026-JARC/RO-CAEIRL-CPNPJICAMARCA del Proyecto: Servicio: "MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMISARIA PNP JICAMARCA"

Que, en atención al documento en referencia con la finalidad de solicitar Ampliación de Plazo N° 01 por 30 días calendarios para el **Servicio: "MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMISARIA PNP JICAMARCA"**

I. GENERALIDADES:

1.1. DATOS GENERALES DE LA OBRA:

Contratista:

CONTRATO	:	N° 013-2026-NEMAEC
Nombre	:	Corporación Alonfer E.I.R.L.
Representante Legal	:	José Mitchell Chávez Caballero
Residente de obra	:	Ing. Jhonny Anthony Ramirez Cruz

Supervisión:

Monitor de Obra	:	Ing John Eloy Lizarbe Valdez CIP 99652.

Plazos:

- **Contratista:**

Entrega del terreno	:	28 de enero del 2026.
Inicio del plazo contractual	:	28 de enero del 2026.
Fin plazo contractual	:	13 de marzo del 2026

1.2. ANTECEDENTES:

De la Obra:

- Se suscribe mediante contrato de Obra N° 013-2026-NEMAEC Núcleo Ejecutor para el Mantenimiento Acondicionamiento y Equipamiento de Comisarias y LA EMPRESA Corporación Alonfer E.I.R.L., por un monto de S/. 318,258.66 que incluye todos los impuestos de ley, bajo el sistema de Servicios, para el Servicio: "MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMISARIA PNP JICAMARCA"
- Con fecha 28.01.2026, se realiza la entrega de terreno al Contratista, pero no se contó con una copia oficial del Expediente Técnico.
- Con fecha 28.01.2026, se suscribió el Acta de Acuerdo CPNP JICAMARCA , se viene cuantificando los Deductivos Vinculante y Adicionales.
- Con fecha 28.01.2026, se suscribió el Acta de Constancia de Restriccion de Ambientes.

II. JUSTIFICACION DE LOS ADICIONALES

Cambio de piso en el dormitorio de Policia femenino por presentar filtración y encontrarse dañado-Primer piso.

Mayor área de tratamiento anti salitre en muros por presencia de filtraciones-Oficina del Comisario, Dormitorio del Comisario entre otros ambientes.

Sistema de perfileria en mal estado de cielo raso suspendido para ambientes del primer y segundo piso.

Remoción de baldosas en mal estado en el ambiente OPC muy aparte del retiro según Planilla de Metrado-Segundo piso.

Protección con cobertura Aluzinc debido al cielo raso suspendido en mal estado en el Dormitorio de Sub oficiales 2 del Segundo piso debido al deterioro de las baldosas y por las lluvias que afectaron a la cobertura existente de termo muro. Asimismo, se cubrió el área del techo del ambiente Oficinas de Medidas de Protección.

El monto por el Adicional Deductivo vinculante asciende a s/ 16,198.43

III. ANTECEDENTES CONTRACTUALES

El Servicio de Mantenimiento y Acondicionamiento de la Infraestructura de la CPNP Jicamarca se ejecuta conforme a los siguientes documentos contractuales:

- Ficha Técnica aprobada.
- Cronograma de avance vigente.
- Términos de Referencia contractuales.
- Cuaderno de Obra debidamente legalizado.

El plazo contractual fue determinado considerando condiciones normales de ejecución, dentro de las cuales se contemplaba:

- Disponibilidad continua de los ambientes a intervenir.
- Ejecución simultánea de frentes de trabajo.
- Acceso permanente a las áreas programadas.
- Ausencia de interferencias operativas institucionales.

El servicio de mantenimiento en la CPNP JICAMARCA se ejecuto en una sede con funcionamiento ininterrumpido (24/7), lo que impidió la liberación masiva de los frentes de trabajos que limitaron la disponibilidad de determinados ambientes.

Dichas restricciones obligaron a sectorizar la intervención de los ambientes y reprogramar las actividades previstas en el cronograma, generando una afectación directa en la ruta crítica del servicio.

IV. ANALISIS Y SUSTENTO TECNICO:

4.1.Restricciones operativas de la entidad

- **Causa:** Funcionamiento permanente (24 horas) de la comisaría.
- **Efecto:** Limitación de acceso a ambientes.
- **Impacto:** Reducción de frentes de trabajo → afectación directa de la ruta crítica.
- **Responsabilidad:** No atribuible al contratista.

4.2. Restricción de cortes eléctricos

- **Causa:** Continuidad de servicios policiales.
- **Efecto:** Imposibilidad de ejecutar trabajos eléctricos en tiempos programados.

- **Impacto:** Reprogramación de partidas críticas.
- **Responsabilidad:** Entidad usuaria.

4.3. Deficiencias técnicas del expediente

- **Causa:** Subestimación del tratamiento de eflorescencia y metrados incompletos.
- **Efecto:** Retrabajos y ampliación de procesos constructivos.
- **Impacto:** Demora en actividades de acabados.
- **Tiempo afectado:** 12 días
- **Responsabilidad:** No atribuible al contratista.

3.4. Eventos fortuitos

a) Filtración en muro

- Impacto: 06 días
- Requiere secado técnico previo

b) Colapso de desagüe

- Impacto: 02 días
- Intervención no prevista
- **Responsabilidad:** Caso fortuito

- **Tiempo adicional deductivo vinculante:** 10 días

➢ Por incongruencias en la Ficha Técnica de Mantenimiento-Comisaria Jicamarca 02.14 DESMONTAJE de 37 und TOMACORRIENTES

➢ La partida 06.04.05 MONTAJE DE TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL solo autoriza 5 unidades de tomacorriente, actualmente se está instalando tomacorrientes para todos los ambientes a intervenir con la finalidad de que sean funcionales, el uso de recursos adicionales conlleva tiempo y retrasos en obra.

➢ La partida 03.02.01 PROVISIÓN DE ACERO PARA ESTRUCTURAS para columnas metálicas para el Comedor no aplica según la norma A. 010 Condiciones Generales de Diseño y la norma G. 050 Seguridad durante la Construcción exigen cierres perimetrales y techos estables para la protección de usuarios y seguridad.

El procedimiento a seguir según TRATAMIENTO Y RESANE DE MURO CON PRESENCIA DE EFLORESCENCIA, INCLUIDO ACABADO DE PINTURA expuesto en el Plano A-01 no garantiza la calidad de los trabajos, solo ha conllevado a retrabajos así que se mejoró el procedimiento a seguir retirando el tarrajeo y acto seguido aplicar mortero con anti salitre para garantizar la adherencia de la pintura. La actividad del picado del tarrajeo exige uso de mas recursos como

acarreo del material producto del picado y traslado del mismo lo cual hace que se incrementen los tiempos de los procesos o actividades, garantizando el aseguramiento de la calidad de los trabajos, pero generando impactos en los plazos de entrega de los trabajos.

Intervencion en la red principal de desague:

El hecho de que parte del desagüe colapso que se encuentra ubicado en el patio frente al SSHH Varones-1° Piso llevo al Contratista a tomar de acciones correctivas y continuar con los trabajos de instalaciones sanitarias según la Ficha Técnica.

- MANTENIMIENTO DEL TABLERO GENERAL según el Plano IE-01 indica directrices a seguir en contraste de la partida 06.02.02 REEMPLAZO DE TABLERO GENERAL.

- Se comunico mediante Cuaderno de Obra de Asiento N° 33 de fecha 26 de febrero del 2026 al Monitor de Obra Marlenne Bustamante Mena sobre la filtración que se presentó en uno de los muros del ambiente: Dormitorio de Policía Femenino, tuvo impacto en la programación de los trabajos al ser un hecho fortuito y no ser parte del Mapeo del Plano IS-01 y el día 12 de marzo se pudo terminar de empastar el área afectada por filtración pues el tiempo mínimo después de haber retirado una fuga es entre 7 a 14 días.
- Se comunico mediante Cuaderno de Obra de Asiento N° 39 de fecha 03 de marzo del 2026 al Monitor de Obra CAP 32295 y al actual Monitor de Obra vigente Ing. John E. Lizarbe Valdez sobre el colapso de desagüe fuera del SS HH Varones-1° Piso, tuvo impacto en la programación de los trabajos al ser un hecho fortuito y no ser parte del Mapeo del Plano IS-02. Por demora de los trabajos realizados desde la etapa de acciones correctiva-Ref: INFORME N° 003-2026-JARC/RO-CPNPJICAMARCA.

- Se comunico mediante Cuaderno de Obra de Asiento N° 42 de fecha 04 de marzo del 2026 al Monitor de Obra Ing. John E. Lizarbe Valdez sobre el muro del Dormitorio de Policía Femenino que fue afectado por la filtración de agua.
- Se comunico mediante Cuaderno de Obra de Asiento N° 44 de fecha 06 de marzo del 2026 la verificación de los trabajos conjuntamente con el Monitor de Obra Ing. John E. Lizarbe Valdez sobre el empaste con base imprimante y lijado del ambiente: Oficina del Comisario (Cabe indicar que la intervención de uno de sus muros solo aplica el RESANE Y PINTADO DE FISURAS EN MURO EN TRAMO DE 1.50 M según Mapeo del Plano A-01).

3.5. Conclusión del análisis causal

Las causas identificadas:

- Son externas al contratista
- Han sido registradas en cuaderno de obra

- Afectan directamente la ruta crítica

→ **Sustentan técnicamente la ampliación de plazo**

V. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

3.1 Cronograma contractual (resumen)

Actividad	Inicio	Fin	Estado
Trabajos preliminares	28/01	02/02	Ejecutado
Demoliciones	03/02	08/02	Ejecutado
Instalaciones	09/02	20/02	Afectado
Acabados	21/02	10/03	Afectado
Entrega	13/03	13/03	No cumplido

3.2 Actividades afectadas (ruta crítica)

- Tratamiento de muros con eflorescencia
- Trabajos eléctricos
- Acabados (empaste y pintura)
- Reparaciones sanitarias

3.3 Cronograma reprogramado

Actividad	Nueva Fecha Inicio	Nueva Fecha Fin
Continuación instalaciones	17/03	08/04
Acabados finales	24/03	11/04
Pruebas y correcciones	08/04	11/04
Entrega final	12/04	12/04

3.4 Nueva fecha de término

📌 **12 de abril de 2026**

VI. PLAN DE TRABAJO

Se plantea el siguiente plan para garantizar la culminación dentro del plazo ampliado:

5.1 Estrategia de ejecución

- Incremento de frentes de trabajo según disponibilidad
- Trabajo sectorizado por ambientes
- Coordinación diaria con la comisaría

5.2 Medidas técnicas

- Uso de aditivos antisalitre en muros
- Control de humedad antes de acabados
- Ejecución progresiva de trabajos eléctricos

5.3 Recursos
Mano de obra:

- Incremento de personal en acabados

Equipos:

- Equipos de secado y ventilación
- Herramientas para retrabajos

5.4 Control y seguimiento

- Supervisión diaria
- Registro en cuaderno de obra
- Validación por monitor

VII. CONCLUSIONES

- El retraso está debidamente sustentado técnicamente.
- Las causas no son atribuibles al contratista.
- La ampliación es necesaria para garantizar calidad y cumplimiento.

VIII. RECOMENDACIONES

- Aprobar la Ampliación de Plazo N° 01 por 30 días calendario.
- Validar el cronograma reprogramado.
- Autorizar la continuidad del servicio.

IX. ANEXOS

- Contrato N° 013-2026-NEMAEC
- Cuaderno de obra
- Registro fotográfico
- Cronograma detallado (Gantt)
- Informes técnicos

NÚCLEO EJECUTOR PARA EL MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE COMISARÍAS - NEMAEC

CONVENIO N°005-2025-FONCODES

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CPNP JICAMARCA

CONTRATO N°013-2026-NEMAEC

Conste por el presente documento, la contratación del Servicio de Mantenimiento y Acondicionamiento de la Infraestructura de la CPNP Jicamarca - Lurigancho , que celebran de una parte el Núcleo Ejecutor para el Mantenimiento, Acondicionamiento y Equipamiento de Comisarías - NEMAEC, en adelante "LA ENTIDAD CONTRATANTE", con RUC N°20614998033, con domicilio legal en CALLE MANCO SEGUNDO N°2621, Distrito de Lince, Provincia y Departamento de Lima, representado por el señor **MIGUEL IVAN ALARCÓN PARCO**, identificado con DNI N°40382546, y de la otra parte el CONSORCIO ALORSEN integrado por la empresa CORPORACION ALONFER E.I.R.L., con RUC N°20607342009, y la empresa Jair Humberto González Cavero, con RUC N°10107325650, formalizado a través del Contrato Privado de Consorcio de fecha 27 de enero de 2026, con firmas legalizadas de los consorciados ante el Notario de Lima, Abogado JOSÉ L. MONTOYA VERA, debidamente representado por su Representante Común, el señor **JOSÉ MITCHELL CHÁVEZ CABALLERO**, Identificado con DNI N°43518257, según acuerdo contenido en la Cláusula Novena del Contrato de Consorcio, señalando domicilio legal para efectos de notificaciones relacionadas a la ejecución del contrato en Jirón Rodolfo Beltrán Mz. G Dpto. 15 – Lima – Lima – Lima, con teléfono celular N°940268832 y domicilio PJ LOS CARTUCHOS N°477-BAR. SAN MARTÍN (ESPALDAS DEL COLEGIO INGENIERÍA), Cajamarca – Cajamarca – Cajamarca, a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA"; en los términos y condiciones siguientes:

MIGUEL IVAN ALARCON PARCO
PRESIDENTE
NEMAEC

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 30 de diciembre de 2025, la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales – UGPE de FONCODES, remitió al NEMAEC, mediante OFICIO N°00334-2025-MIDIS/FONCODES/UGPE, la Ficha Técnica aprobada de la CPNP Jicamarca - Lurigancho, para el acondicionamiento de la Comisaría CPNP Jicamarca - Lurigancho, de conformidad con la opinión técnica favorable contenida en el Informe N°011-2025-OORV.

La citada Ficha Técnica ha sido elaborada para el mantenimiento y acondicionamiento integral de la CPNP Jicamarca - Lurigancho, considerando los plazos de ejecución y comprendiendo las metas, metrados, criterios de intervención y presupuesto requerido para optimizar la capacidad operativa de dicha dependencia policial, en concordancia con el objeto de la intervención previsto en Convenio N°005-2025-FONCODES, según la Norma Técnica N°05-2025-FONCODES/UGPE y lo establecido en el Art. 16 de la Ley 32416.

Con fecha 15 de enero de 2026, LA ENTIDAD CONTRATANTE, mediante la Convocatoria N°008-2026-NEMAEC, invitó a las empresas interesadas a presentar propuestas técnico - económicas para el "Servicio de Mantenimiento y Acondicionamiento de la Infraestructura de la CPNP Jicamarca - Lurigancho, según la Norma Técnica N°05-2025-FONCODES/UGPE y lo establecido en el Art. 16 de la Ley 32416". Asimismo, con fecha 22 de enero de 2026, LA ENTIDAD CONTRATANTE, mediante Acta de Comité de Adjudicación del mismo día, otorgó la Buena Pro a la empresa CONSORCIO ALONFER, cuyo consentimiento fue publicada al siguiente día, a través de la página Web de FONCODES.

CamScanner
Escaneado con CamScanner

NÚCLEO EJECUTOR PARA EL MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE COMISARÍAS - NEMAEC

CONVENIO N°005-2025-FONCODES

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratación del SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CPNP JICAMARCA - LURIGANCHO, para optimizar su capacidad operativa y, con ello fortalecer la labor de la Policía Nacional del Perú en el Distrito de JICAMARCA, conforme a las características y condiciones establecidas en los Términos de Referencia y el presente contrato.

Esta acción se realizará en el marco del Convenio de Cooperación interinstitucional suscrito entre el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS y el Ministerio del Interior-MININTER, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 16.1 del Artículo 16 de la Ley N°32416.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ 318,258.66 (TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 66/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo total del servicio, incluyendo de ser aplicable, todos los impuestos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA, en soles, luego de emitida el ACTA DE CONFORMIDAD DE EJECUCIÓN y la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en la Norma Técnica N°05-2025-FONCODES/UGPE.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá los diez (10) días calendarios, de producida la recepción del servicio.

LA ENTIDAD CONTRATANTE debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

MIGUEL IVÁN ALARCON PARCO
PRESIDENTE
NEMAEC

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de cuarenta y cinco (45) días calendarios, el mismo que se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por los TERMINOS DE REFERENCIA y sus respectivos Anexos (Anexos N°01, N°02, N°03, N°04 y N°05), la Ficha Técnica aprobada por la UGPE-FONCODES y el Acta de Reunión de Inicio y Compromiso de Ejecución Técnica, así como, la Declaración Jurada de Capacidad Operativa y No Superposición de Recursos.

CamScanner
Escaneado con CamScanner

NÚCLEO EJECUTOR PARA EL MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE COMISARÍAS - NEMAEC

CONVENIO N°005-2025-FONCODES

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA será responsable ante LA ENTIDAD CONTRATANTE por los daños o desperfectos que pudiera ocasionar a la PNP o en caso de la entrega del servicio diferente a lo solicitado. El servicio objeto del presente contrato, deberá contar con una garantía mínima de dieciocho (18) meses, computados desde el día siguiente de la conformidad del servicio.

CLÁUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación será otorgada por la administración de LA ENTIDAD CONTRATANTE, previa verificación de que los servicios recibidos se ajustan estrictamente a los Términos de Referencia y Fichas Técnicas aprobadas por la UGPE. Para el otorgamiento de la conformidad, es requisito indispensable el cierre y entrega del Cuaderno de incidencias debidamente diligenciado y firmado, así como la presentación de las pruebas de operatividad según el RNE.

De identificarse observaciones, LA ENTIDAD CONTRATANTE comunicará formalmente a EL CONTRATISTA, indicando su sentido de manera clara y precisa. Se otorgará un plazo de tres (03) días calendario para la subsanación, el cual podrá variar en función de la complejidad o sofisticación de las correcciones requeridas. Si, vencido el plazo otorgado, EL CONTRATISTA no subsana las observaciones a cabalidad, LA ENTIDAD CONTRATANTE no concederá períodos adicionales para correcciones. En este supuesto, corresponderá aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo original de subsanación, sin que se consideren los días en los que LA ENTIDAD CONTRATANTE haya incurrido para efectuar las revisiones y notificar las observaciones.

CLÁUSULA NOVENA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas el presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con LA ENTIDAD CONTRATANTE en caso de incumplimiento.

MIGUEL IVAN ALARCON PARCO
PRESIDENTE
NEMAEC

CLÁUSULA DÉCIMA: PENALIDADES POR MORA E INCUMPLIMIENTOS ESPECÍFICOS

El incumplimiento de EL CONTRATISTA en la entrega del servicio contratado, en el plazo y condiciones establecidas, originará la aplicación de una penalidad ascendente al 0.5% del monto del contrato por cada día de atraso, hasta un tope de 10% del monto total del contrato (Monto que será evaluado por el NEMAEC), los que serán descontados del pago de la valorización final del contrato.

EL CONTRATISTA deberá presentar mediante el personal clave (residente de obra), plan de trabajo, procedimientos de actividades, protocolos de liberación de partidas nuevas, intervenidas o reparadas. El residente presentará una programación anticipada de liberación de los protocolos, coordinada previamente con el Núcleo Ejecutor. De no realizar lo mencionado líneas arriba, se aplicará una penalidad del 10% del monto total del contrato.

Se deberá de realizar las pruebas requeridas en el proyecto (operatividad y funcionamiento), según el RNE. De no realizar lo mencionado líneas arriba, se aplicará una penalidad del 10% del monto total del contrato. Las herramientas o equipos utilizados deberán estar en buenas condiciones, calibrados si fuera el caso. De no realizar lo mencionado líneas arriba, se aplicará una penalidad del 3% del monto total del contrato.

CamScanner
Escaneado con CamScanner

EL CONTRATISTA deberá presentar mediante su residente de obra el cronograma sincerado al inicio de la ejecución y durante, si fuera necesario, o a solicitud del NÚCLEO EJECUTOR. De no realizar lo mencionado líneas arriba, se aplicará una penalidad del 10% del monto total del contrato.

En ningún caso el retraso en la entrega de las instalaciones podrá exceder diez días. Si el atraso fuera mayor al tope de la penalidad señalada precedentemente, se resolverá la Orden de Servicio o Contrato, previa evaluación del NEMAEC.

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

- DOMICILIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: CALLE MANCO SEGUNDO N°2621, Distrito de LINCE, Provincia y Departamento de Lima.
- DOMICILIO DEL CONTRATISTA: JIRÓN RODOLFO BELTRÁN MZ. G DPTO. 15 – DISTRITO, PROVINCIA Y REGIÓN LIMA.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

MIGUEL IVAN ALARCON PARCO
PRESIDENTE
NEMAEC

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, total o parcialmente, en los siguientes casos:

a) Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuación del contrato.
b) Incumplimiento de obligaciones, por causa atribuible a la parte que incumple.
c) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuación del contrato.
d) Por incumplimiento de la cláusula anticorrupción.
e) Por la presentación de documentación falsa o inexacta durante la ejecución del contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente.

Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan. Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato

CamScanner
Escaneado con CamScanner

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO

A la suscripción del contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier personal de LA ENTIDAD CONTRATANTE. Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios, actores del proceso de contratación y/o cualquier servidor de LA ENTIDAD CONTRATANTE, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito. En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la ejecución del contrato, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o parcialmente el contrato. Cuando lo anterior se produzca por parte de EL CONTRATISTA, el incumplimiento de la presente cláusula conllevará que sea excluido de los próximos procesos de contratación de servicios del Núcleo Ejecutor. En ningún caso, dichas medias impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Para todo lo no previsto en la presente contratación, es de aplicación supletoria la Constitución Política del Perú, así como, las normas de derecho público que resulten aplicables a las contrataciones de bienes y/o servicios, las disposiciones pertinentes del Código Civil y demás normas de derecho privado, en ese orden de prelación.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier controversia o diferencia que surja sobre la aplicación del contrato, incluida lo que se refiera a su nulidad e invalidez, será resuelta de manera definitiva e inapelable mediante arbitraje de derecho, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable.

El arbitraje se llevará a cabo en la Cámara de Comercio de Lima. Antes de iniciar el proceso arbitral, las partes se obligan a agotar la etapa de Trato Directo por un periodo no menor a cinco (05) días hábiles para resolver discrepancias técnicas o administrativas.

El arbitraje será resuelto por un Tribunal Arbitral compuesto por tres árbitros. Cada parte designará un árbitro en su solicitud de arbitraje y respuesta, respectivamente y estos árbitros designarán al tercero, quien presidirá el Tribunal Arbitral. Vencido el plazo para la respuesta a la solicitud de arbitraje sin que se hubiera designado al árbitro correspondiente, la parte interesada solicitará ante la respectiva Cámara de Comercio, dentro del plazo de cinco (05) días hábiles, la respectiva designación.

MIGUEL IVAN ALARCON PARCO
PRESIDENTE
NEMAEC

CamScanner
Escaneado con CamScanner

Si una vez designados los dos árbitros conforme al procedimiento antes referido y en caso éstos no consigan ponerse de acuerdo sobre la designación del tercer árbitro dentro del plazo de cinco (05) días hábiles de recibida la aceptación del último arbitro, cualquiera de las partes podrá solicitar a la respectiva Cámara de Comercio de la designación del tercer árbitro dentro del plazo de cinco (05) días hábiles. El laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo inapelable ante el poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

EL CONTRATISTA se comprometa a:

- Guardar la debida reserva sobre la información que produzcan o respecto de la cual tengan acceso como resultado de la ejecución del Contrato, así como, a utilizar adecuadamente la información o documentación que se les proporcione y/o que tengan acceso, siendo que puede ser destinada única y exclusivamente a efectos del cumplimiento del Contrato, comprometiéndose además a no compartir la misma con terceros, salvo autorización expresa del NEMAEC.
- A mantener reserva absoluta sobre la infraestructura y documentación de la CPNP JICAMARCA a la que tenga acceso, prohibiéndose cualquier registro fotográfico o difusión no autorizada de áreas críticas por motivos de seguridad institucional de la PNP.
- Acatar y dar cumplimiento a toda norma, instrucción, acuerdo, contrato o procedimiento emitido por el NEMAEC con respecto al acceso y manejo de la información y las prácticas para resguardarlos.

De acuerdo con las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima, a los veintisiete (27) días del mes de enero de 2026.

B

MIGUEL IVAN ALARCON PARCO
PRESIDENTE
NEMAEC

"LA ENTIDAD CONTRATANTE"

Sr. MIGUEL IVAN ALARCÓN PARCO

Presidente NEMAEC

CONSORCIO ALONFER
JOSE MITCHELL CHAVEZ CABALLERO
DNI N° 43518253
Representante Común

"EL CONTRATISTA"

Sra. JOSE MITCHELL CHAVEZ CABALLERO

Represente Común CONSORCIO ALONFER

CamScanner
Escaneado con CamScanner

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Registro fotográfico

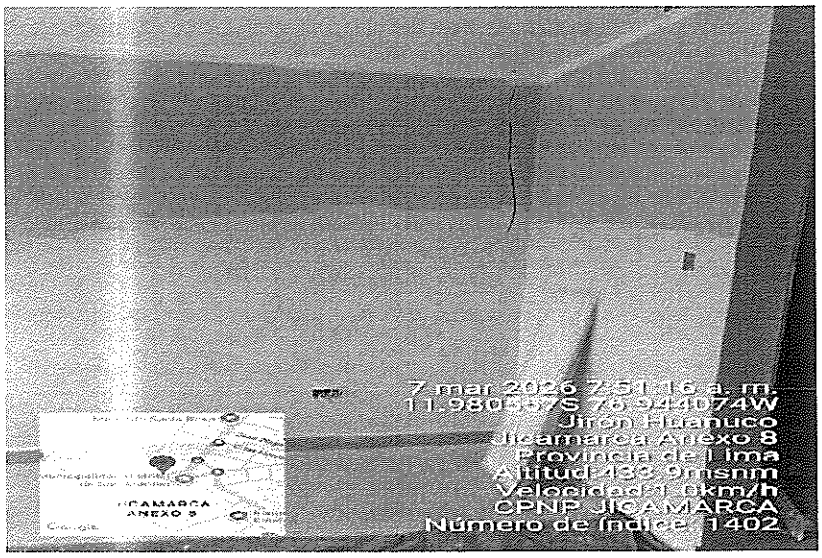

1. Verificación de trabajos de empaste en muro-ambiente: Dormitorio de Policía Femenino-1° Piso. Dicho muro fue afectado por filtración el día 26 de febrero del 2026.

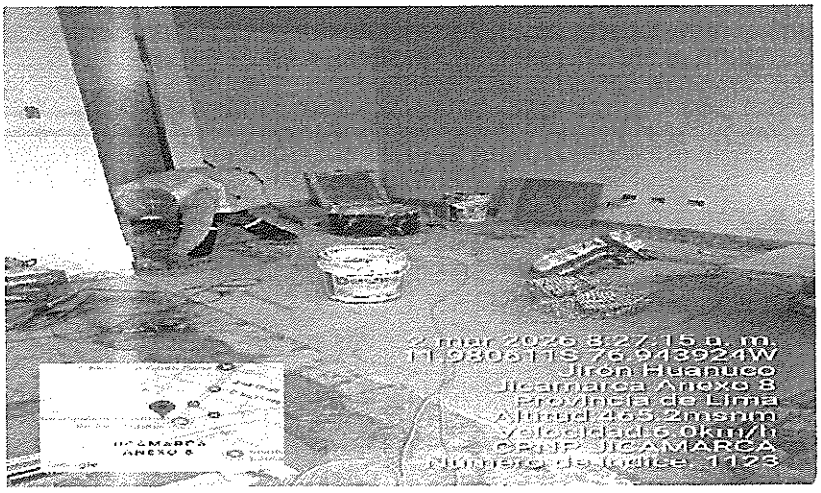

2. Verificación de trabajos de enchape de piso en muro-ambiente: Dormitorio de Policía Femenino-1° Piso. Dicho muro fue afectado por filtración el día 26 de febrero del 2026 como medidas de acción correctiva se retiro parte del enchape existente para mapear la filtración.

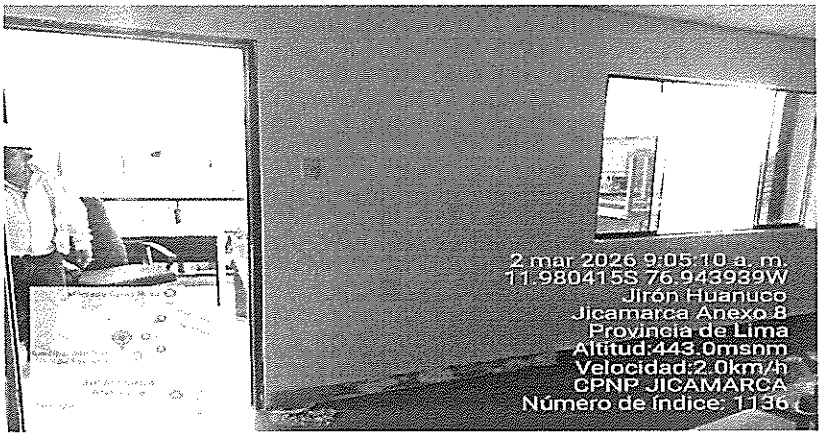

3. Se procedió al retiro parcial del contrazocalo existente : OPC-2° Piso debido a las maniobras del retiro del contrazocalo se debilito parte de la tabiquería drywall existente del ambiente en mención.

4. Siguiendo las buenas prácticas se hizo la intervención del SSHH Varones desde afuera debido a que colapso el sistema de desagüe para garantizar la calidad de los trabajos.

Me suscribo,

Atentamente,

Jhonny Anthony Ramirez Cruz
Residente de Obra
CIP N° 158965

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

INFORME N° 002-2026-JARC/RO-CPNPJICAMARCA

PARA : Arq. Marlenne Bustamante Mena
Monitor de Obra

DE : Ing. Jhonny Anthony Ramirez Cruz
Residente de Obra

ASUNTO : **REEMPLAZO DE TUBERIA DE RED DE AGUA-AMBIENTE DORMITORIO POLICIA FEMENINA-1° PISO**

REFERENCIA :**Servicio "MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMISARIA PNP JICAMARCA"**

FECHA : **Jicamarca, domingo, 01 de marzo del 2026.**

Por medio del presente me dirijo a Ud. para saludarlo cordialmente y a la vez manifestarle lo siguiente:

Que, con la finalidad de dar cumplimiento a las metas establecidas en el **Servicio: "MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMISARIA PNP JICAMARCA"** durante el desarrollo de las actividades para la entrega del Dormitorio Policía Femenino se detectó filtración en uno de sus muros el día 25 de febrero del 2026 alrededor de las 16:36 pm. Se tomo medidas de acción correctivas del retiro del contrazocalo existente y se corto parte del área del piso existente. Se detecto agua empozada luego del retiro del cerámico. Al día siguiente se procedió a la remoción parcial del piso hasta encontrar la filtración y proceder con el cambio de tubería pvc ½" de agua fría.
El día 26 de febrero del 2026 alrededor de las 17:22 pm se tuvo la visita de su persona y el My PNP Miguel Alarcón Parco jefe del Área de Infraestructura representante del Núcleo Ejecutor identificado con DNI N° 40382546.
Cabe indicar que el área a intervenir a nivel de retiro de red es solo el SSHH Policía Femenina que incluye ducha. La filtración se presentó en el área del Dormitorio Femenina-1° Piso.
El suministro e instalación de enchape de piso nuevo beige porcelanato 0.60x0.60 para del Dormitorio Femenina-1° Piso fue validado por su persona Monitor de Obra CAP 32295 como obra complementaria al Servicio para el cumplimiento de las metas.
Al ser un ambiente que no requería intervención según los planos y bases se considera un vicio oculto y por tanto genera impacto en plazos de la entrega de los ambientes.

Es todo cuanto informa a Usted, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente

Jhonny Anthony Ramirez Cruz

ANEXOS

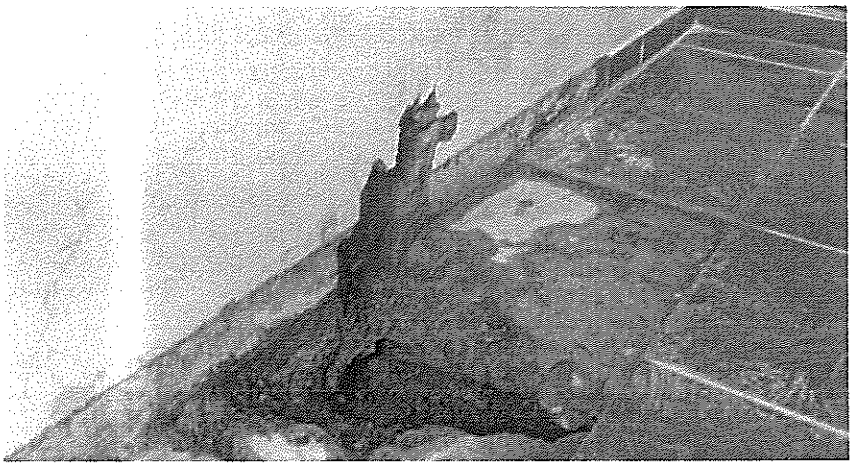

1. Vista actual del ambiente afectado: Dormitorio Policía Femenina-1° Piso

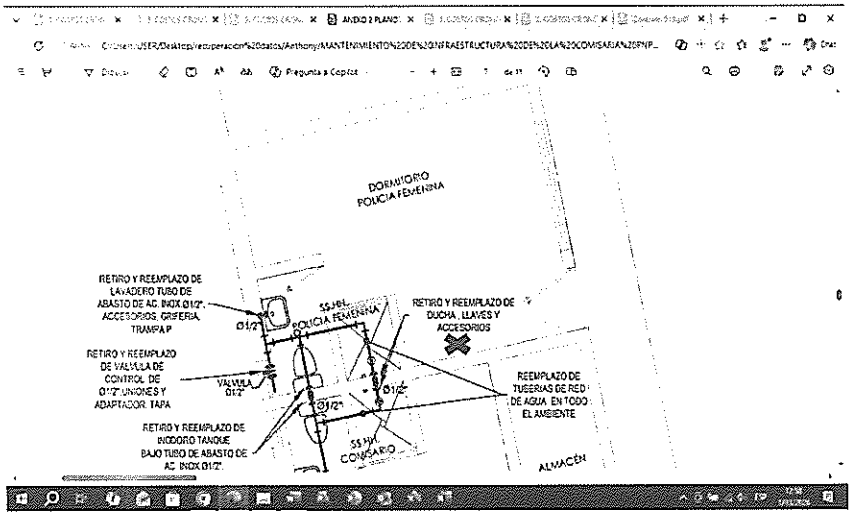

2. Vista área de intervenciones de los ambientes-1° Piso. El área afectada no forma parte de la intervención.

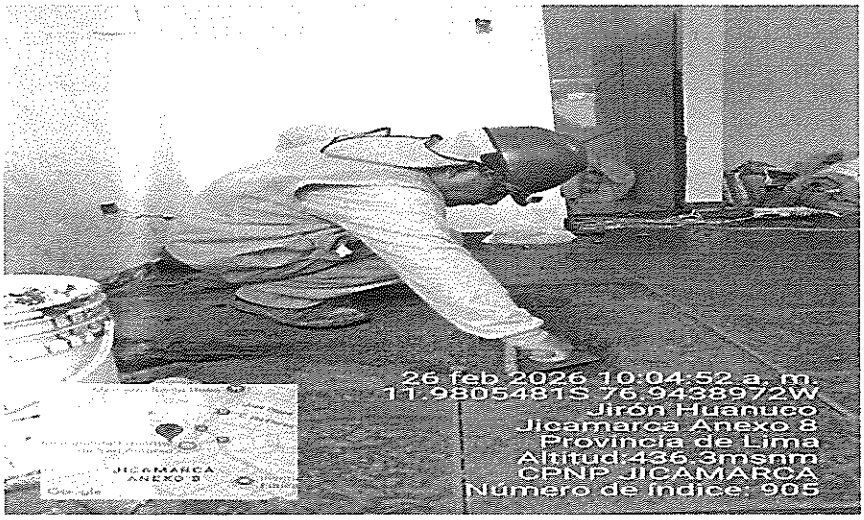

3. Vista interior del ambiente: Dormitorio Policía Femenina-1° Piso

4. Se realizo el retiro del enchape existente para encontrar la filtración: Dormitorio Policía Femenina-1° Piso

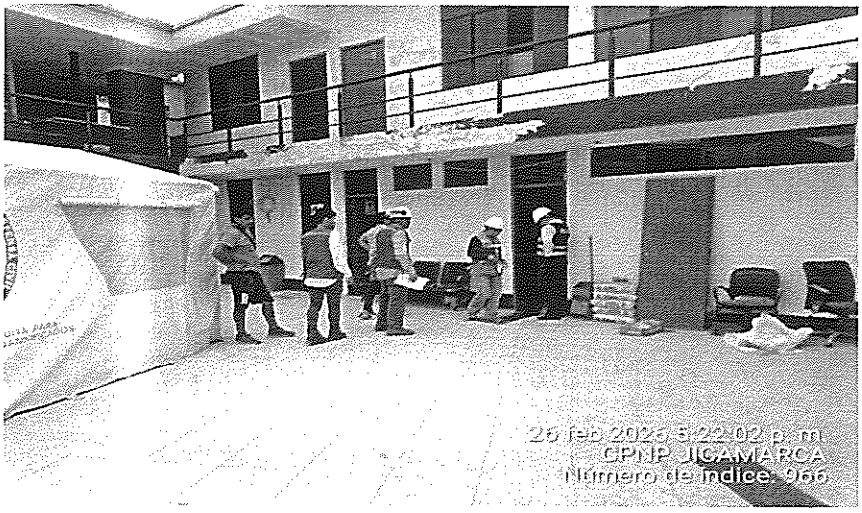

5. Visita de su persona y el My PNP Miguel Alarcón Parco jefe del Área de Infraestructura representante del Núcleo Ejecutor

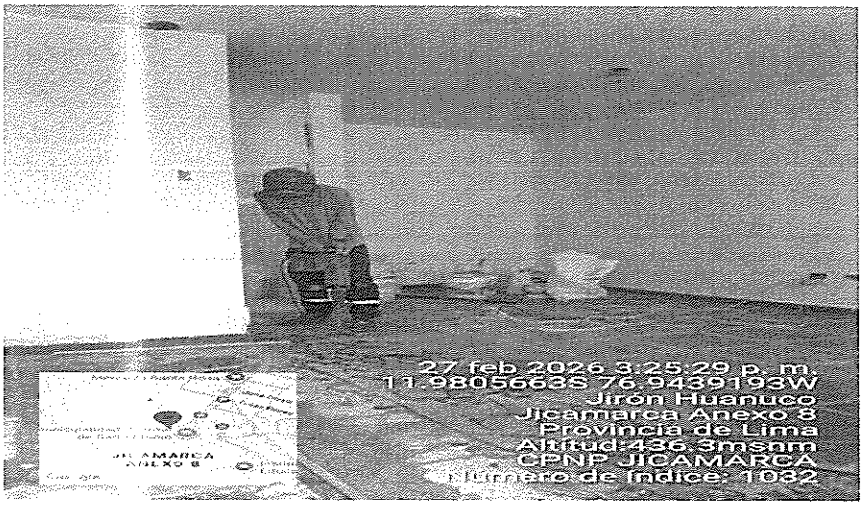

6. Trabajos de remoción de piso existente bajo autorización previa de su persona: Dormitorio Policía Femenino-1° Piso

7. Elección del color beige y enchape: porcelanato 0.60x0.60 a usar bajo autorización previa de su persona: Dormitorio Policía Femenino-1° Piso

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

INFORME N° 003-2026-JARC/RO-CPNPJICAMARCA

PARA : Arq. Marlenne Bustamante Mena
Monitor de Obra

DE : Ing. Jhonny Anthony Ramirez Cruz
Residente de Obra

ASUNTO : **RETIRO Y REPARACION DE TUBERIA DE RED DE DESAGUE-COLAPSADO FUERA DEL SS HH VARONES-PATIO -1° PISO**

REFERENCIA : **Servicio "MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMISARIA PNP JICAMARCA"**

FECHA : **Jicamarca, martes, 03 de marzo del 2026.**

Por medio del presente me dirijo a Ud. para saludarlo cordialmente y a la vez manifestarle lo siguiente:

Que, con la finalidad de dar cumplimiento a las metas establecidas en el **Servicio: "MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMISARIA PNP JICAMARCA"** durante el desarrollo de las actividades para la entrega del SS HH VARONES se detectó un colapso fuera del baño en mención el día 03 de marzo del 2026 alrededor de las 8:58 a.m. Como medidas de acción correctiva se picó parte del enchape del piso existente de Patio hasta llegar a la caja de registro de desagüe. La intervención de retiro de redes de agua solo abarca en áreas de los ss hh pero fue necesario el cambio de tubería desde afuera para que el sshh Varones sea funcional. También se detectó las dimensiones de la caja siendo de 0.15x0.35 m que no cumple con las dimensiones mínimas según la norma I.S. 010 Instalaciones Sanitarias del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), para una mejora continua se incrementó el área de las dimensiones de la caja de registro de desagüe para un espacio más cómodo para el mantenimiento.

.

Los trabajos a realizar implican picado de piso existente, acarreo interno del material producto del picado, traslado de material producto del picado, retiro de tubería, suministro e instalación de tubería y enchape de piso y colocación de tapa de registro según nuevas dimensiones para el Servicio y el cumplimiento de las metas.
Al ser un ambiente que no requería intervención según los planos y bases se considera un hecho imprevisible y por tanto genera impacto en plazos de la entrega de los ambientes indicados en los planos.

Es todo cuanto informa a Usted, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente

Jhonny Anthony Ramirez Cruz

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

ANEXOS

1. Vista actual del colapso de sistema de desagüe: ref. enfrente ambiente: SS HH Varones-1° Piso

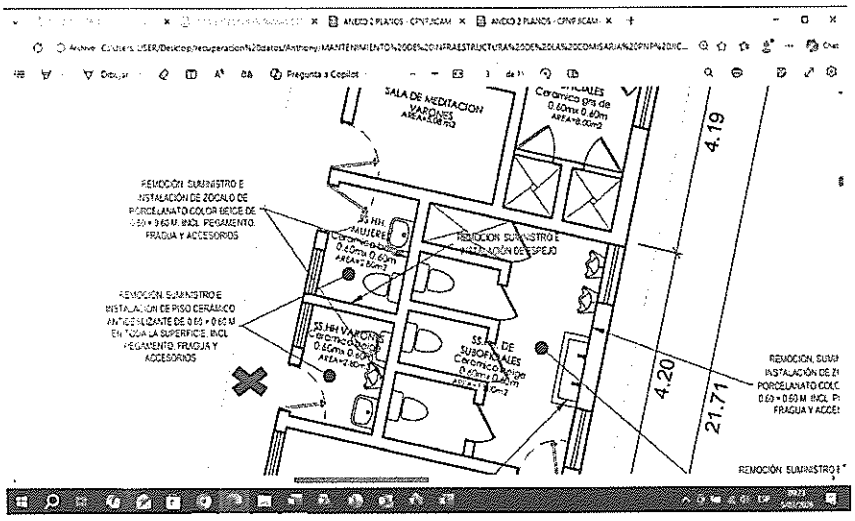

2. Vista área de intervenciones de los ambientes SS HH Varones-1° Piso. El área afectada **X** no forma parte de la intervención.

3. Vista interior del ambiente: SS HH Varones -trabajos de retiro de tubería de desague-1° Piso

4. Vista de la dimensión de la caja de registro de desagüe insitu: SS HH Varones -1° Piso

5. Trabajos realizados de reemplazo de tuberías de desagüe- SS HH Varones -1° Piso

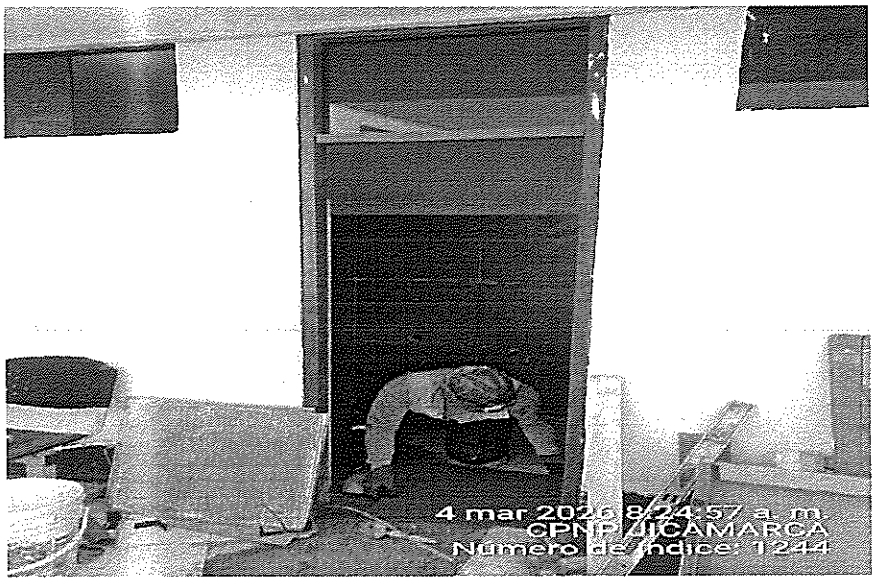

6. Trabajos que no forman parte de la Intervención del SS HH Varones pero que fueron necesarios para que los servicios sean funcionales-1° Piso

7. Trabajos culminados y presentación de la nueva dimensión de la caja de registro de desagüe frente al SS HH Varones-1° Piso

SERVICIO: " MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISARIA PNP JICAMARCA"					
	JICAMARCA - DEDUCTIVOS				
		UNID.	METRADO	PRECIO S/.	PARCIAL S/.
02	TRABAJOS PRELIMINARES				
2.04	DESMONTAJE DE PUERTA	m2	3.36	8.85	29.74
2.05	DESMONTAJE DE PORTON METALICO -INGRESO	m2	4.14	33.15	137.24
03	ESTRUCTURAS				
03.02.01.01	PROVISIÓN DE ACERO PARA ESTRUCTURAS	KG	38.14	11.56	440.90
03.02.02	MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS				
03.02.02.01	INSTALACIÓN DE COLUMNA METÁLICO (ANCLADO EN LOSA EXISTENTE)	und	8.00	109.74	877.92
03.02.03	PINTURA EN ESTRUCTURA METÁLICA				
03.02.03.01	PINTURA EN ESTRUCTURA METÁLICAS C/ ANTICORROSIVO (ZINCROMATO) 2 MANOS INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN	m2	22.88	8.89	203.40
03.02.03.02	PINTURA EN ESTRUCTURA METALICAS C/ EPÓXICO 2 MANOS	m2	22.88	11.66	266.78
04	ARQUITECTURA				
04.04	PUERTAS				
04.04.04	PUERTA METÁLICA CON MARCO METÁLICO Y VENTANILLA CORREDIZA DE PLANCHA ESTRIADA CON REFUERZO DE FIERRO LISO, MALLA ZARANDA , CERROJO Y CANDADO – SEGÚN DISEÑO (INC.BASE ANTICORROSIVO, PINTADO, ESMALTE) AMBIENTE DE MEDITACION	und	2.00	1,900	3,800.00
04.04.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA METALICA DE PROTECCION DE TUBO CUADRADO EN INGRESO, INC. BASE ANTICORROSIVA Y PINTADO	m2	4.14	154.39	639.17
04.04.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARA CON VIDRIO LAMINADO DE	m2	4.14	714.53	2,958.15
05	INSTALACIONES SANITARIAS				
05.05	SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE				
05.05.01	MOVIMIENTOS DE TIERRA				
05.05.01.01	EXCAVACIÓN DE TERRENO NATURAL	m3	9.45	27.07	255.81
05.05.01.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	9.45	27.07	255.81
05.05.01.03	COMPACTACIÓN DE FONDO	m2	0.96	5.96	5.72
05.05.02	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				
05.05.02.01	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	49.61	6.15	305.10
05.05.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	0.85	32.39	27.53
05.05.02.03	CONCRETO F'C=175 KG/CM2	m3	0.31	404.19	125.30
05.05.02.04	CONCRETO F'C=210 KG/CM2	m3	0.27	433.51	117.05
05.05.03	CAJÓN PERIMÉTRICO DE BLOQUES DE CONCRETO				
05.05.03.01	MURO DE BLOQUES DE CONCRETO 14X39X19CM CON MORTERO	m2	14.90	95.20	1,418.48
05.05.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE				
05.05.04.01	CISTERNA DE POLIETILENO DE 2800 LITROS, INCLUYE ACCESORIOS	glb	1.00	2,600.00	2,600.00
06	INSTALACIONES ELECTRICAS				
06.02	MANTENIMIENTO CORRECTIVO				
06.02.02	REEMPLAZO DE TABLERO GENERAL	glb	1.00	1,734.32	1,734.32
				TOTAL	16,198.43

PRESUPUESTO-ADICIONALES

SERVICIO :" MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISARIA PNP JICAMARCA"

ENTIDAD EJECUTORA : NEMAEC 13.26

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	METRADO	PRECIO S/.	PARCIAL S/.
02	TRABAJOS PRELIMINARES				
2.06	REMOCION DE ENCHAPE CERAMICO O PORCELANATO	m2	18.36	20.69	379.87
2.08	REMOCION DE BALDOSAS (60 X60) EN CIELO RASO	und	43.00	2.36	101.48
2.11	REMOCION DE FALSO CIELO RASO INC BALDOSAS PERFILES, ANGULOS		90.78	6.64	602.78
03.02.04	COBERTURAS				
03.02.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA DE PANEL ALUZINC TR-4XG 0.25mm	m2	101.10	59.23	5,988.19
4.01	PISOS				
04.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 0.6 M X 0.60 M	m2	16.66	74.17	1,235.70
04.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION CONTRAZÓCALO DE PORCELANATO E=0.10 M	m	16.59	66.65	1,105.72
04.03	CIELO RASOS				
04.03.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSAS DE FIBRACEMENTO 0.60X0.60MX4MM-OPC	und	43	9.85	423.55
04.03.06	SUM. E INSTALACION DE FALSO CIELO RAZO DE BALDOSAS INC. RIELES, ANGULOS Y PERFILES Y CORDONES	m2	112.93	46.76	5,280.61
4.06	MUROS Y TABIQUES				
04.06.02	LIMPIEZA, TRATAMIENTO DE EFLORESCENCIA, RESANE EN MURO-OF COMISARIO	m2	2.01	32.06	64.44
04.06.03	EMPASTE DE PARED CON BASE IMPRIMANTE Y LIJADO	m2	38.17	14.64	558.81
04.06.04	PREPARACION DE SUPERFICIE -DECAPADO MURO	m2	38.17	2.69	102.68
04.06.05	PINTURA SATINADA EN MUROS INTERIORES (2 MANOS)	m2	38.17	9.29	354.60
				TOTAL	16,198.43

PLANILLA DE METRADO

Proyecto : MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISARIA PNP JICAMARCA-Ubicacion: LURIGANCHO, LIMA, LIMA.

PARTIDA	Und	Largo(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Area(m2)	Cantidad	N.Veces	Parte	PARCIAL	TOTAL
02 TRABAJOS PRELIMINARES										
02.06 REMOCION DE CERAMICO O PORCELANATO		m2								18.36
Primer Piso										
Dormitorio Policia Femenina										
Piso y Contrazocalo						18.36	1.00		18.36	
02.08 REMOCION DE BALDOSAS (60X60CM) EN CIELO RASO		und								
Segundo Piso										43.00
OPC						43.00	1.00		43.00	
02.11 REMOCION FALSO CIELO RASO INC BALDOSAS PERFILES, ANGULOS		m2								90.78
Segundo Piso										
Dormitorio de Suboficiales						1.00			77.52	
Oficina de Medidas de Protección						1.00			13.26	
03 ESTRUCTURAS										
03.02 04 COBERTURAS										
03.02.04.01 COBERTURA DE PANEL ALUZINC TR-4XG 0.25 MM	m 2									101.10
Segundo piso										
Dormitorio 2 Sub Oficiales						89.76	1.00		89.76	
Oficina de Medidas de Protección						11.34	1.00		11.34	

PARTIDA	Und	Largo(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Area(m2)	Cantidad	N.Veces	Parte	PARCIAL	TOTAL
04 ARQUITECTURA										
04.01 PISOS										
04.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 0.6 M X 0.60 M										16.66
Primer Piso										
Dormitorio Policia Femenina					16.66	1.00			16.66	
04.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION CONTRAZOCALO DE PORCELANATO E=0.10 M	m									16.59
Primer Piso										
Dormitorio Policia Femenina		16.59				1.00			16.59	
04.03 CIELO RASOS										
04.03.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSAS DE FIBRA CRMENTO	und									43.00
Segundo Piso						43.00			43.00	
OPC										
04.03.06 SUMINISTRO E INSTALACION FALSO CIELO RAZO DE BALDOSAS INC. RIELES, ANGULOS Y PERFILES Y	m2									112.93
Primer Piso										
Sala de Espera					22.15	1.00			22.15	
Segundo piso										
Oficina de Medidas de Protección					13.26	1.00			13.26	
Dormitorio de Suboficiales					77.52	1.00			77.52	
04.06 MUROS										
04.06.02 LIMPIEZA, TRATAMIENTO DE EFLORESCENCIA, RESANE EN MURO	m2									2.01
Primer Piso										
Oficina Comisario					2.01	1.00			2.01	
04.06.03 PREPARACION DE SUPERFICIE - DECAPADO	m2				38.17	1.00			38.17	
04.06.04 EMPASTE DE PARED CON BASE IMPRIMANTE Y LIJADO	m2				38.17	1.00			38.17	
04.06.05 PINTURA SATINADA EN MUROS INTERIORES (2 MANOS)	m2				38.17	1.00			38.17	
Primer Piso										
Oficina Comisario					38.17	1.00			38.17	

CRONOGRAMA VALORIZADO ACTUALIZADO DE OBRA

PROYECTO: SERVICIO "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISARIA PNP JICAMARCA"

UBICACIÓN: LIMA-JICAMARCA

ITEM	PARTIDAS	COSTO PARCIAL	del 14/03/2026 al 21/03/2026	del 22/03/2026 al 28/03/2026	del 29/03/2026 al 04/04/2026	del 05/04/2026 al 12/04/2026
	OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD Y SALUD					
	ALMACEN Y OFICINA PROVISIONAL	S/ 85.00	S/ 27.20	S/ 23.80	S/ 23.80	S/ 10.20
	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	S/ 50.00	S/ 19.00	S/ 15.50	S/ 15.50	
	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL	S/ 88.00	S/ 33.80	S/ 27.58	S/ 27.58	
	ELABORACION E IMPLEMENTACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	S/ 300.00	S/ 300.00			
	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	S/ 455.54	S/ 455.54			
	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	S/ 114.86	S/ 43.64	S/ 35.61	S/ 35.61	
	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DURANTE EL TRABAJO	S/ 78.49	S/ 29.12	S/ 21.98	S/ 21.98	S/ 9.42
	TRABAJOS PRELIMINARES					
	LIMPIEZA DURANTE LA EJECUCION	S/ 237.29	S/ 90.17	S/ 73.55	S/ 73.55	
	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE AREAS A INTERVENIR	S/ 123.34	S/ 46.87	S/ 38.23	S/ 38.23	
	DESMONTAJE DE VENTANA	S/ 25.73	S/ 8.23	S/ 17.50		
	DESMONTAJE DE PUERTA	S/ 63.19	S/ 20.22	S/ 42.97		
	REMOCION DE ENCHAPE CERAMICO O PORCELANATO	S/ 3,124.60	S/ 999.87	S/ 874.89	S/ 874.89	S/ 374.95
	REMOCION DE AREAS VERDES	S/ 274.03	S/ 90.43	S/ 129.79	S/ 54.81	
	REMOCION DE BALDOSAS (60 X60) EN CIELO RASO	S/ 136.88	S/ 43.80	S/ 93.08		
	REMOCION DE ESPEJO	S/ 5.46	S/ 3.06	S/ 2.43		
	DESMONTAJE DE MAMPARAS	S/ 86.30	S/ 48.33	S/ 37.97		
	REMOCION DE FALSO CIELO RASO INC BALDOSAS PERFILES, ANGULOS	S/ 61.75	S/ 34.58	S/ 27.17		
	DESMONTAJE DE LUMINARIAS	S/ 90.35	S/ 29.82	S/ 42.46	S/ 18.07	
	DESMONTAJE DE TOMACORRIENTES	S/ 102.92	S/ 33.96	S/ 48.37	S/ 20.59	
	DESMONTAJE DE INTERRUPTORES	S/ 73.04	S/ 24.10	S/ 34.33	S/ 14.61	
	DESMONTAJE DE ALARMA CONTRA INCENDIOS	S/ 76.45	S/ 25.23	S/ 35.93	S/ 15.29	
	DESMONTAJE DE LUZ DE EMERGENCIA	S/ 17.40	S/ 5.74	S/ 8.18	S/ 3.48	
	REMOCION DE CANALETAS PVC	S/ 137.64	S/ 45.42	S/ 64.69	S/ 27.53	
	DESMONTAJE DE COBERTURA EXISTENTE	S/ 153.91	S/ 50.79	S/ 72.34	S/ 30.78	
	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE MADERA PARA COBERTURA	S/ 97.03	S/ 17.47	S/ 62.10	S/ 17.47	
	REMOCION DE LAVAMANOS Y ACCESORIOS	S/ 19.52	S/ 7.57	S/ 6.18	S/ 6.18	
	REMOCION DE GRIFERIA Y ACCESORIOS	S/ 50.84	S/ 19.24	S/ 15.70	S/ 15.70	
	REMOCION DE INODORO Y ACCESORIOS	S/ 53.12	S/ 20.19	S/ 16.47	S/ 16.47	
	REMOCION DE DUCHA Y ACCESORIOS	S/ 37.17	S/ 14.12	S/ 11.52	S/ 11.52	
	REMOCION DE URINARIO Y ACCESORIOS	S/ 19.52	S/ 7.57	S/ 6.18	S/ 6.18	
	REMOCION DE VALVULA ESFERICA DE CONTROL 1/2"	S/ 115.02	S/ 43.71	S/ 35.66	S/ 35.66	
	REMOCIÓN DE TUBO DE AGUA - 1/2" Y ACCESORIOS EN PISO Y PARED	S/ 18.87	S/ 7.17	S/ 5.85	S/ 5.85	
	REMOCIÓN DE TUBO DE DESAGUE EN PISO Y PARED	S/ 20.36	S/ 7.74	S/ 6.31	S/ 6.31	
	REMOCION DE SUMIDERO 2"	S/ 67.59	S/ 25.65	S/ 20.93	S/ 20.93	
	REMOCION DE REGISTRO 4"	S/ 94.50	S/ 35.91	S/ 29.30	S/ 29.30	
	ACARREO INTERNO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y PICADO	S/ 23.62	S/ 9.75	S/ 7.14	S/ 7.14	
	TRASLADO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y PICADO A PUNTO DE ELIMINACION (DIST. MAX 20 m)	S/ 17.26	S/ 6.56	S/ 5.35	S/ 5.35	
	ELIMINACION FINAL DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION, DESMONTAJE Y REMOCION	S/ 600.00		S/ 102.00	S/ 348.00	S/ 150.00
	ESTRUCTURAS					
	ADECUACION Y ELEVACION DE TANQUE ELEVADO					
	ELEVACION DE ESTRUCTURA METALICA DE TANQUE ELEVADO- 1 M	S/ 800.00		S/ 136.00	S/ 464.00	S/ 200.00
	ESTRUCTURA METALICA -COBERTURAS					
	PROVISIÓN DE ACERO PARA ESTRUCTURAS					
	PROVISIÓN DE ACERO PARA ESTRUCTURAS	S/ 2,409.91	S/ 601.73	S/ 1,808.18		
	MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS					
	MONTAJE DE VIGUETA METÁLICO	S/ 8,203.47	S/ 2,050.87	S/ 6,152.61		
	PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA					
	PINTURA EN ESTRUCTURA METALICAS C/ ANTICORROSIVO (ZINCROMATO) 2 MANOS INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN	S/ 329.75	S/ 82.19	S/ 246.56		
	PINTURA EN ESTRUCTURA METALICAS C/ EPÓXICO 2 MANOS	S/ 431.19	S/ 107.80	S/ 323.39		
	COBERTURAS					
	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA DE PANEL ALUZINC TR-4XG 0.25 mm	S/ 2,692.60	S/ 457.74	S/ 1,561.71	S/ 673.15	
	ARQUITECTURA					
	PISOS					
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 0.6 M X 0.60 M	S/ 3,655.84		S/ 731.17	S/ 1,718.24	S/ 1,206.43
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE BEIGE DE 0.50 M X 0.50 M	S/ 656.91		S/ 131.38	S/ 328.75	S/ 216.78
	SUMINISTRO E INSTALACION PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE COLOR GRIS, DE 0.40 M X 0.40 M	S/ 884.28		S/ 176.86	S/ 415.61	S/ 291.81
	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS					
	SUMINISTRO E INSTALACION ZÓCALO DE PORCELANATO DE 0.60 M X 0.60 M	S/ 9,432.94		S/ 754.64	S/ 5,093.79	S/ 3,584.52
	SUMINISTRO E INSTALACION CONTRAZÓCALO DE PORCELANATO E=0.10 M	S/ 4,784.14		S/ 382.73	S/ 2,583.43	S/ 1,817.97
	CIELO RASOS			S/ -	S/ -	
	LIMPIEZA, TRATAMIENTO DE SALITRE E IMPERMEABILIZADO EN CIELO RASO	S/ 2,497.49		S/ 422.87	S/ 1,442.74	S/ 621.87
	PREPARACION DE SUPERFICIE -DECAPADO	S/ 153.49		S/ 32.89	S/ 112.23	S/ 48.37
	EMPASTE DE CIELO RASO CON BASE IMPRIMANTE Y LIJADO	S/ 1,021.41		S/ 173.64	S/ 592.42	S/ 255.35
	PINTURA LATEX EN CIELORRASO (2 MANOS)	S/ 1,338.35		S/ 236.02	S/ 805.24	S/ 347.09
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSAS DE FIBRACRMENTO 0.60X0.60MX4MM	S/ 571.30		S/ 97.12	S/ 331.35	S/ 142.83
	SUM. E INSTALACION DE FALSO CIELO RAZO DE BALDOSAS INC. RIELES, ANGULOS Y PERFILES Y CORDONES	S/ 3,034.29		S/ 524.33	S/ 1,788.89	S/ 771.07
	RELLENO, RESANE Y SELLADO DE VACÍOS EN PUNTOS DE LUZ	S/ 359.00		S/ 61.20	S/ 208.60	S/ 90.00
	PUERTAS					
	PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA C/MARCO DE MADERA – SIN LUNETA, SEGÚN DISEÑO	S/ 1,019.34	S/ 254.84	S/ 591.22	S/ 173.29	
	PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA C/MARCO DE MADERA – CON LUNETA, SEGÚN DISEÑO	S/ 1,765.29	S/ 764.83	S/ 971.46		
	PUERTA DE ALUMINIO, CON MARCO DE ALUMINIO – SEGÚN DISEÑO	S/ 1,204.93	S/ 542.22	S/ 662.71		
	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE MADERA (LIJADO, MASILLADO, PULIDO, PINTADO BARNIZ Y CHAPA)	S/ 770.07	S/ 194.82	S/ 254.12	S/ 254.12	S/ 77.01
	MANTENIMIENTO DE PORTON METÁLICO (LIJADO, INC. REMOVER ÓXIDO, MASILLADO, BASE ANTICORROSIVA Y PINTADO)	S/ 440.73	S/ 198.33	S/ 242.40		
	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE ALUMINIO (INCL. LIMPIEZA, AJUSTE DE BISAGRAS/ACCESORIOS, LUBRICACION Y CORRECCIÓN DE DESALINEAMIENTOS)	S/ 233.51	S/ 88.73	S/ 102.74	S/ 42.03	
	MANTENIMIENTO DE PUERTA METALICA (LIJADO, INC. REMOVER ÓXIDO, MASILLADO, BASE ANTICORROSIVA Y PINTADO)	S/ 128.62	S/ 48.89	S/ 56.72	S/ 23.21	
	SUMINISTRO E INTALACIÓN MAMPARAS INTERIORES	S/ 16,580.71	S/ 3,979.37	S/ 9,471.63	S/ 9,471.63	S/ 1,658.07
	VENTANAS		S/ -	S/ -		
	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA C/MARCO DE ALUMINIO CORREDIZA Y FIJA, INC, VIDRIO LAMINADO 6 MM TIPO	S/ 2,055.09	S/ 349.36	S/ 1,191.95	S/ 513.77	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR - REJA METÁLICA CON TUBO CUADRADO DE 1 1/2 X 1 1/2, E=2.5 MM.	S/ 1,343.19	S/ 228.34	S/ 779.05	S/ 335.80	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA Y RIELES	S/ 1,647.73			S/ 406.50	S/ 1,441.23
	MANTENIMIENTO DE PROTECTOS REJA METALICA INC. REMOVER OXIDO , MASILLADO, BASE Y PINTADO	S/ -	S/ -	S/ -		
	MANTENIMIENTO DE VENTANA, CAMBIO DE PERFILES, SEGUROS, REEMPLAZO DE FELPA	S/ 5,297.27	S/ 531.60	S/ 2,009.16	S/ 2,009.16	S/ 697.35
	MUROS Y TABIQUES		S/ -	S/ -		
	RESANE DE FISURA	S/ 29.16	S/ 5.25	S/ 16.91	S/ 7.00	
	LIMPIEZA, TRATAMIENTO DE EFLORESCENCIA, RESANE EN MURO	S/ 1,541.44	S/ 154.14	S/ 585.75	S/ 585.75	S/ 215.80

	EMPASTE DE PARED CON BASE IMPRIMANTE Y LIJADO	S/	9,325.83	S/	466.29	S/	3,357.30	S/	2,144.54
	PREPARACION DE SUPERFICIE -DECAPADO MURO	S/	1,713.53	S/	303.44	S/	702.55	S/	702.55
	PINTURA SATINADA EN MUROS INTERIORES (2 MANOS)	S/	6,879.80			S/	1,719.95	S/	2,407.93	S/	2,751.92
	PINTURA SATINADA EN MUROS EXTERIORES (2 MANOS)	S/	4,885.66			S/	342.00	S/	2,296.26	S/	2,247.40
	OTROS										
	AREAS VERDES										
	SUMINISTRO E INSTALACION DE AREAS VERDE	S/	1,121.33					S/	280.33	S/	841.00
	ESPEJOS										
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS	S/	135.61					S/	33.90	S/	101.71
	MELAMINE										
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTANTE 1.60 X 0.60	S/	337.35							S/	337.35
	SARDINELES										
	DECAPADO, EMPASTADO Y PINTADO DE SARDINEL	S/	447.76							S/	447.76
	DRYWALL										
	REPARACIÓN DE JUNTAS EN MUROS DE DRYWALL (INCL. TRATAMIENTO DE FISURAS, RESANE CON CINTA Y MASILLA,	S/	31.59							S/	31.59
	ESCALERAS										
	MANTENIMIENTO DE BARANDA METÁLICA (LIJADO, INC. REMOVER ÓXIDO, BASE ANTICORROSIVA Y PINTADO)	S/	122.46			S/	122.46				
	TRAGALUZ PATIO										
	MANTENIMIENTO DE BARANDA METÁLICA (LIJADO, INC. REMOVER ÓXIDO, BASE ANTICORROSIVA Y PINTADO)	S/	1,051.27			S/	231.28	S/	819.99		
	RAMPAS										
	RAMPA DE CONCRETO 175 KG/CM2, CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUNADO S/COLOREAR EN INGRESO	S/	-								
	MURETE DE VIGILANCIA										
	DECAPADO, EMPASTADO Y PINTADO DE MURETE	S/	6.20			S/	6.20				
	COCINA										
	SUMINISTRO E INSTALACION ZÓCALO DE CERÁMICO DE 0.60 M X 0.60 M PARA MESA DE COCINA , LAVADERO	S/	392.87			S/	294.65	S/	98.22		
	RETIRO Y REPOSICION DE REPOSTERO DE MELAMINE CON DIVISIONES INTERIORES	S/	6,000.00			S/	6,000.00				
	PLACA RECORDATORIA										
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA RECORDATORIA SEGUN DISEÑO	S/	250.00					S/	250.00		
	SEÑALIZACION										
	SEÑALETICA DE NOMBRE DE AMBIENTES 0.10M X 0.30M (INC. ADHESIVO + DOBLE ACRILICO CRISTAL 3MM)	S/	277.40			S/	158.12	S/	119.28		
	SEÑALITICA DE SEGURIDAD DE 0.20M X 0.30M (INC. ADHESIVO + DOBLE ACRILICO CRISTAL 3MM)	S/	299.00			S/	170.43	S/	128.57		
	SEÑALITICA DE AVISOS (ADHESIVOS + DOBLE ACRILICO CRISTAL 3MM)	S/	59.60			S/	34.00	S/	25.71		
	INSTALACIONES SANITARIAS										
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO										
	CORTE,PICADO, DESMONTAJE DE TUB Y RESANE DE MURO PARA RENOVACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA FRIA	S/	864.08			S/	345.63	S/	406.12	S/	112.33
	CORTE,PICADO, DESMONTAJE DE TUB Y RESANE DE MURO PARA RENOVACIÓN DE TUBERÍA DE DESAGÜE	S/	333.76			S/	133.50	S/	156.87	S/	43.39
	CORTE,PICADO, DESMONTAJE DE TUB Y RESANE DE PISO PARA RENOVACIÓN DE TUBERÍA DE DESAGÜE	S/	1,527.16			S/	610.86	S/	717.76	S/	198.53
	CORTE,PICADO, DESMONTAJE DE TUB Y RESANE DE PISO PARA RENOVACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA FRIA	S/	1,935.37			S/	774.15	S/	909.62	S/	251.60
	RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRIA										
	TUBERÍA PVC DE AGUA CLASE 10 - 1/2 AGUA FRIA	S/	1,241.97			S/	496.79	S/	583.73	S/	161.46
	TUBERÍA PVC DE AGUA CLASE 10 - 3/4 AGUA FRIA	S/	72.37			S/	28.95	S/	34.01	S/	9.41
	TUBERÍA PVC DE AGUA CLASE 10 - 1 AGUA FRIA	S/	643.25			S/	257.31	S/	302.33	S/	83.62
	CODO PVC - SAP CLASE 10 R 1/2 X 90	S/	273.28			S/	109.31	S/	128.44	S/	35.53
	CODO PVC - SAP CLASE 10 R 3/4 X 90	S/	10.19			S/	4.08	S/	4.79	S/	1.32
	CODO PVC - SAP CLASE 10 R 1 X 90	S/	12.21			S/	4.88	S/	5.74	S/	1.59
	CODO REDUCTOR 3/4 A 1 PVC - SAP CLASE 10	S/	10.41			S/	4.16	S/	4.89	S/	1.35
	TEE PVC - SAP CLASE 10 R 1/2 X 90	S/	179.34			S/	71.74	S/	84.29	S/	23.31
	SALIDA DE AGUA FRIA - D=1/2 PVC SAP	S/	1,856.79			S/	742.72	S/	872.69	S/	241.38
	TAPA DE NICHO PARA VALVULA O LLAVE DE PASO	S/	591.30			S/	236.52	S/	277.91	S/	76.87
	VÁLVULA O LLAVE DE PASO D=1/2 (BRONCE CROMADO), INC. ACCESORIOS	S/	657.02			S/	262.81	S/	308.80	S/	85.41
	PRUEBA HIDRÁULICA	S/	244.41			S/	97.76	S/	114.87	S/	31.77
	RED DE DISTRIBUCIÓN DE DESAGUE										
	TUBERÍA PVC DE DESAGÜE 2	S/	278.01			S/	91.74	S/	130.65	S/	55.60
	TUBERÍA PVC DE DESAGÜE 4	S/	753.51			S/	248.66	S/	354.15	S/	150.70
	YEE PVC - SAL 4X4	S/	116.52			S/	38.45	S/	54.76	S/	23.30
	YEE PVC - SAL 4X2	S/	174.78			S/	57.68	S/	82.15	S/	34.96
	YEE PVC - SAL 2X2	S/	58.26			S/	19.23	S/	27.38	S/	11.65
	CODO PVC - 2X 45°	S/	94.85			S/	31.30	S/	44.58	S/	18.97
	CODO PVC - 4X 45°	S/	75.24			S/	24.83	S/	35.36	S/	15.05
	REDUCCIÓN PVC - SAL 4X2	S/	55.24			S/	18.23	S/	25.96	S/	11.05
	SALIDA DE DESAGÜE EN PVC SAP, D=2	S/	900.00			S/	297.00	S/	423.00	S/	180.00
	SALIDA DE DESAGÜE EN PVC SAP, D=4	S/	858.00			S/	283.14	S/	403.26	S/	171.60
	SUMIDERO DE BRONCE DE 2, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	S/	438.83			S/	144.81	S/	206.25	S/	87.77
	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	S/	410.97			S/	135.62	S/	193.16	S/	82.19
	PRUEBA HIDRÁULICA DE ESCORRENTÍA DE TUBERÍAS DE DESAGÜE	S/	262.50			S/	86.63	S/	123.38	S/	52.50
	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS										
	LAVATORIO DE LOSA VITRIFICADA TIPO MANANTIAL, C/GRIFERIA PERILLA PESADO INC. ACCESORIOS	S/	1,550.95			S/	387.74	S/	809.55	S/	263.66
	GRIFERIA	S/	-			S/	-	S/	-	S/	-
	INODORO TANQUE BAJO DE LOSA 1RA CALIDAD ADULTO, INC. ACCESORIOS	S/	2,302.80			S/	575.70	S/	1,335.62	S/	391.48
	LLAVE DE DUCHA S/SALIDA CROMADA C/MESCLADORA INC. ACCESORIOS	S/	2,568.80			S/	641.70	S/	1,488.74	S/	438.36
	URINARIO DE LOSA BLANCO TIPO CADET	S/	965.25			S/	241.31	S/	559.85	S/	164.09
	SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE										
	MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO										
	MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO DE 1100 LT, INC. CAMBIO DE MULTICONECTOR, VALVULA FLOTADORA, VISOR Y ACCESORIOS	S/	860.42					S/	860.42		
	DRENAJE PLUVIAL										
	CANALETA DE PVC 4	S/	1,433.53			S/	114.68	S/	831.45	S/	487.40
	ABRAZADERA DE METAL PARA CANALETA DE 4	S/	688.17			S/	55.05	S/	399.14	S/	233.98
	ABRAZADERA 02 OREJAS DE METAL (2mm) X 4	S/	91.44			S/	7.32	S/	53.04	S/	31.09
	TUBERIA PVC, D=4	S/	950.20			S/	76.02	S/	551.12	S/	323.07
	CODO PVC SAL 4X90°	S/	142.55			S/	11.40	S/	82.63	S/	48.47
	INSTALACIONES ELECTRICAS										
	HABILITACIÓN Y MONTAJE DE LUMINARIAS, INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES										
	HABILITACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA	S/	139.68			S/	76.20	S/	59.88		
	HABILITACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE	S/	514.92			S/	280.96	S/	225.55		
	HABILITACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIFILAR SIMPLE	S/	104.76			S/	57.67	S/	46.09		
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO										
	MANTENIMIENTO POZO A TIERRA	S/	813.00					S/	455.23	S/	357.77
	PICADO Y RESANE DE MURO Y CIELO RASO P/EMPOTRAR TUBERIAS DE LUZ	S/	5,805.09	S/	2,612.29	S/	3,192.80				
	PICADO Y RESANE DE MURO Y PISO P/EMPOTRAR TUBERIAS DE TOMACORRIENTES	S/	2,457.41	S/	1,105.83	S/	1,351.58				
	PICADO Y RESANE DE MURO Y CIELO RASO P/EMPOTRAR TUBERIAS DE INTERRUPTOR UNIFILAR SIMPLE	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-		
	RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉTRICA EMPOTRADO										
	TUBERIA PVC - SAP DE 25 MM	S/	1,527.16	S/	473.42	S/	671.55	S/	381.79		
	CABLE ELECTRICO NH80, 2.5 MM2	S/	1,072.45	S/	332.46	S/	471.88	S/	268.11		
	CABLE ELECTRICO NH80, 4.0 MM2	S/	369.48	S/	114.53	S/	162.56	S/	92.37		
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, LUCES DE EMERGENCIA Y TOMACORRIENTES										
	MONTAJE DE LUMINARIA PRISMATICO 1200X300 LED 36W (INCLUYE CABLEADO)	S/	2,389.24			S/	191.14	S/	1,385.76	S/	812.34

	MONTAJE DE LUMINARIA 60X60 PANEL LED 36W (INCLUYE CABLEADO)	S/	3,432.54		S/	274.60	S/	1,990.87	S/ 1,167.66
	MONTAJE DE LUMINARIA DOWLIGHT REDONDO ADOSADO LED 36W (INCLUYE CABLEADO)	S/	1,667.04		S/	65.36	S/	618.83	S/ 982.79
	MONTAJE DE LUZ DE EMERGENCIA (INCLUYE CABLEADO)	S/	623.32		S/	50.27	S/	364.43	S/ 213.63
	MONTAJE DE TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL	S/	-		S/	-	S/	-	S/ -
	MONTAJE DE INTERRUPTOR SIMPLE	S/	45.77		S/	3.66	S/	26.55	S/ 15.56
	MONTAJE DE ALARMA CONTRA INCENDIOS A BATERIA	S/	63.58		S/	5.25	S/	38.04	S/ 22.39
	SISTEMA DE BOMBEO								
	ELECTROBOMBA 1 5 HP INCLU CABLEADO, ACCESORIOS Y TUBERIAS	S/	1,031.74				S/	600.46	S/ 431.28
	TABLERO AUTOMATICO PARA CONTROL DE LECTROBOMBA, CABLEADO, ACCESORIOS Y TUBERÍAS	S/	820.53						S/ 820.53
	PRUEBAS SISTEMA ELÉCTRICO								
	PRUEBAS, MEDIDAS ELÉCTRICAS Y PUESTA EN SERVICIO	S/	500.00						S/ 500.00
	COSTO DIRECTO TOTAL	S/	167,489.48	S/	18,850.97	S/	56,776.82	S/	59,342.87	S/ 32,518.81
	GASTOS GENERALES (%)	S/	2,219.48	S/	519.88	S/	517.88	S/	517.88	S/ 663.86
	UTILIDAD (8%)	S/	13,399.16	S/	1,508.08	S/	4,542.15	S/	4,747.43	S/ 2,601.51
	SUBTOTAL	S/	183,108.12	S/	20,878.91	S/	61,836.85	S/	64,608.18	S/ 35,784.18
	IMPUESTO IGV (18%)	S/	32,959.46	S/	3,758.20	S/	11,130.63	S/	11,629.47	S/ 6,441.15
	PRESUPUESTO TOTAL	S/	216,067.58	S/	24,637.12	S/	72,967.48	S/	76,237.65	S/ 42,225.33
	AVANCE % PARCIAL		69.50%		7.92%		23.47%		24.52%	13.58%
	AVACE % ACUMULADO		100.00%		7.92%		31.40%		55.92%	69.50%

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISARIA PNP JICAMARCA**	**22 días**	**sáb 14/03/26**	**sáb 11/04/26**
2		**OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD Y SALUD**	**22 días**	**sáb 14/03/26**	**sáb 11/04/26**
3		ALMACEN Y OFICINA PROVISIONAL	22 días	sáb 14/03/26	sáb 11/04/26
4		MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	16 días	sáb 14/03/26	sáb 4/04/26
5		SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL	16 días	sáb 14/03/26	sáb 4/04/26
6		ELABORACION E IMPLEMENTACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	5 días	sáb 14/03/26	vie 20/03/26
7		EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	5 días	sáb 14/03/26	vie 20/03/26
8		EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	16 días	sáb 14/03/26	sáb 4/04/26
9		RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DURANTE EL TRABAJO	22 días	sáb 14/03/26	sáb 11/04/26
10		TRABAJOS PRELIMINARES	18 días	sáb 14/03/26	mar 7/04/26
11		LIMPIEZA DURANTE LA EJECUCION	16 días	sáb 14/03/26	sáb 4/04/26
12		TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE AREAS A INTERVENIR	16 días	sáb 14/03/26	sáb 4/04/26
13		DESMONTAJE DE VENTANA	7 días	mar 17/03/26	mié 25/03/26
14		DESMONTAJE DE PUERTA	7 días	mar 17/03/26	mié 25/03/26
15		REMOCION DE ENCHAPE CERAMICO O PORCELANATO	16 días	mar 17/03/26	mar 7/04/26
16		REMOCION DE AREAS VERDES	12 días	mar 17/03/26	mar 31/03/26
17		REMOCION DE BALDOSAS (60 X60) EN CIELO RASO	5 días	mar 17/03/26	lun 23/03/26
18		REMOCION DE ESPEJO	7 días	mar 17/03/26	mié 25/03/26
19		DESMONTAJE DE MAMPARAS	7 días	mar 17/03/26	mié 25/03/26
20		REMOCION DE FALSO CIELO RASO INC BALDOSAS PERFILES, ANGULOS	7 días	mar 17/03/26	mié 25/03/26
21		DESMONTAJE DE LUMINARIAS	11 días	mar 17/03/26	lun 30/03/26
22		DESMONTAJE DE TOMACORRIENTES	11 días	mar 17/03/26	lun 30/03/26
23		DESMONTAJE DE INTERRUPTORES	11 días	mar 17/03/26	lun 30/03/26
24		DESMONTAJE DE ALARMA CONTRA INCENDIOS	11 días	mar 17/03/26	lun 30/03/26
25		DESMONTAJE DE LUZ DE EMERGENCIA	11 días	mar 17/03/26	lun 30/03/26
26		REMOCION DE CANALETAS PVC	11 días	mar 17/03/26	lun 30/03/26
27		DESMONTAJE DE COBERTURA EXISTENTE	9 días	vie 20/03/26	mar 31/03/26
28		DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE MADERA PARA COBERTURA	9 días	vie 20/03/26	mar 31/03/26
29		REMOCION DE LAVAMANOS Y ACCESORIOS	11 días	vie 20/03/26	sáb 4/04/26
30		REMOCION DE GRIFERIA Y ACCESORIOS	11 días	vie 20/03/26	sáb 4/04/26
31		REMOCION DE INODORO Y ACCESORIOS	11 días	vie 20/03/26	sáb 4/04/26
32		REMOCION DE DUCHA Y ACCESORIOS	11 días	vie 20/03/26	sáb 4/04/26
33		REMOCION DE URINARIO Y ACCESORIOS	11 días	vie 20/03/26	sáb 4/04/26
34		REMOCION DE VALVULA ESFERICA DE CONTROL 1/2"	11 días	vie 20/03/26	sáb 4/04/26

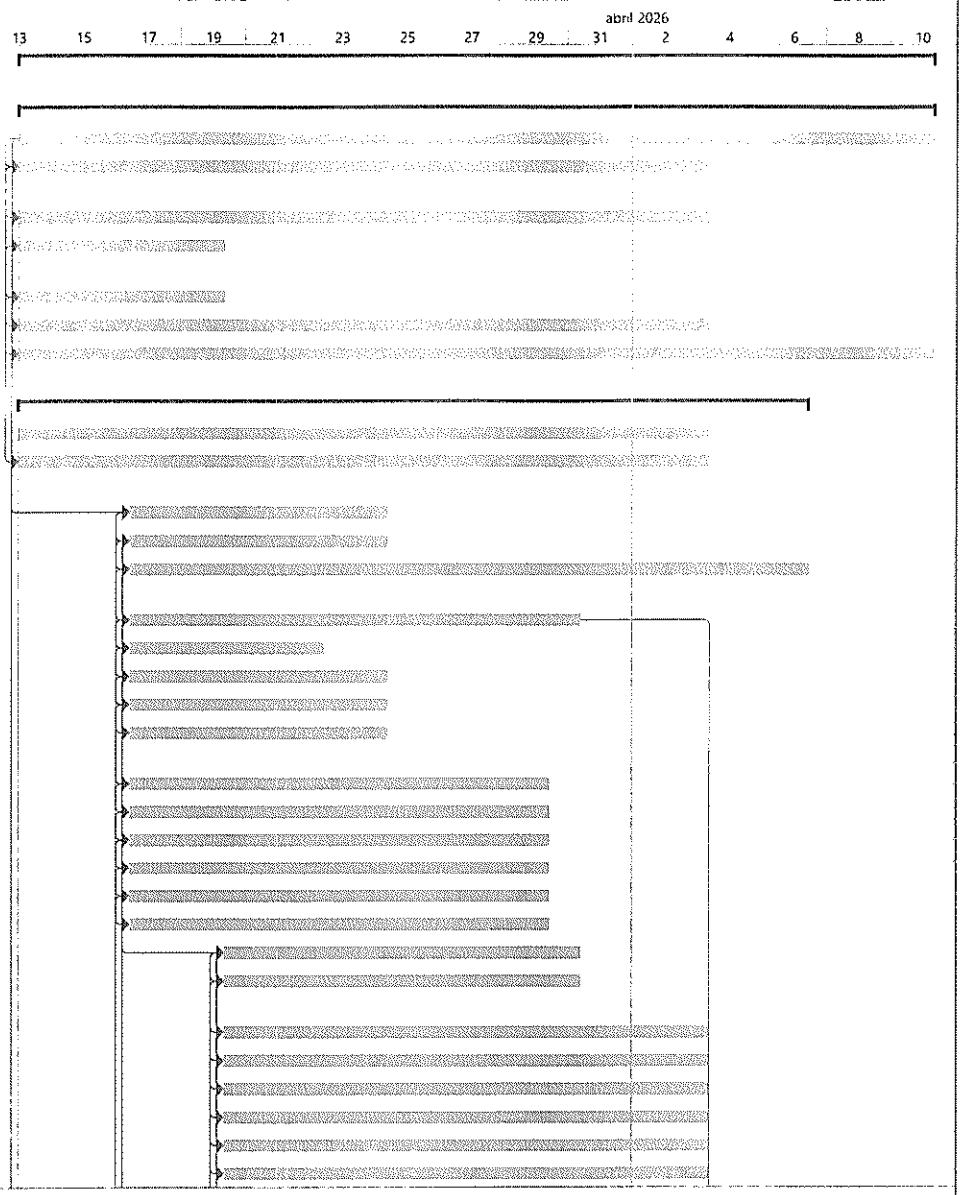

Proyecto: Cronograma Acelerad
Fecha: jue 2/04/26

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
35		REMOCIÓN DE TUBO DE AGUA - 1/2" Y ACCESORIOS EN PISO Y PARED	11 días	vie 20/03/26	sáb 4/04/26
36		REMOCIÓN DE TUBO DE DESAGUE EN PISO Y PARED	11 días	vie 20/03/26	sáb 4/04/26
37		REMOCION DE SUMIDERO 2"	11 días	vie 20/03/26	sáb 4/04/26
38		REMOCION DE REGISTRO 4"	11 días	vie 20/03/26	sáb 4/04/26
39		ACARREO INTERNO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y PICADO	11 días	vie 20/03/26	sáb 4/04/26
40		TRASLADO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y PICADO A PUNTO DE ELIMINACION (DIST. MAX 20 m)	11 días	vie 20/03/26	sáb 4/04/26
41		ELIMINACION FINAL DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION, DESMONTAJE Y REMOCION	7 días	vie 27/03/26	mar 7/04/26
42		**ESTRUCTURAS**	**11 días**	**vie 20/03/26**	**sáb 4/04/26**
43		ADECUACION Y ELEVACION DE TANQUE ELEVADO	5 días	vie 27/03/26	sáb 4/04/26
44		ELEVACION DE ESTRUCTURA METALICA DE TANQUE ELEVADO- 1 M	5 días	vie 27/03/26	sáb 4/04/26
45		**ESTRUCTURA METALICA -COBERTURAS**	**9 días**	**vie 20/03/26**	**mar 31/03/26**
46		**PROVISIÓN DE ACERO PARA ESTRUCTURAS**	**6 días**	**vie 20/03/26**	**vie 27/03/26**
47		PROVISIÓN DE ACERO PARA ESTRUCTURAS	6 días	vie 20/03/26	vie 27/03/26
48		**MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS**	**6 días**	**vie 20/03/26**	**vie 27/03/26**
49		MONTAJE DE VIGUETA METÁLICO	6 días	vie 20/03/26	vie 27/03/26
50		**PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA**	**6 días**	**vie 20/03/26**	**vie 27/03/26**
51		PINTURA EN ESTRUCTURA METALICAS C/ ANTICORROSIVO (ZINCROMATO) 2 MANOS INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN	6 días	vie 20/03/26	vie 27/03/26
52		PINTURA EN ESTRUCTURA METALICAS C/ EPÓXICO 2 MANOS	6 días	vie 20/03/26	vie 27/03/26
53		**COBERTURAS**	**9 días**	**vie 20/03/26**	**mar 31/03/26**
54		SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA DE PANEL ALUZINC TR-4XG 0.25 mm	9 días	vie 20/03/26	mar 31/03/26
55		**ARQUITECTURA**	**20 días**	**mar 17/03/26**	**sáb 11/04/26**
56		**PISOS**	**10 días**	**jue 26/03/26**	**jue 9/04/26**
57		SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 0.6 M X 0.60 M	10 días	jue 26/03/26	jue 9/04/26
58		SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE BEIGE DE 0.50 M X 0.50 M	10 días	jue 26/03/26	jue 9/04/26
59		SUMINISTRO E INSTALACION PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE COLOR GRIS, DE 0.40 M X 0.40 M	10 días	jue 26/03/26	jue 9/04/26
60		**ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS**	**7.13 días**	**sáb 21/03/26**	**sáb 28/03/26**
61		SUMINISTRO E INSTALACION ZÓCALO DE PORCELANATO DE 0.60 M X 0.60 M	8 días	sáb 28/03/26	jue 9/04/26
62		SUMINISTRO E INSTALACION CONTRAZÓCALO DE PORCELANATO E=0.10 M	8 días	sáb 28/03/26	jue 9/04/26

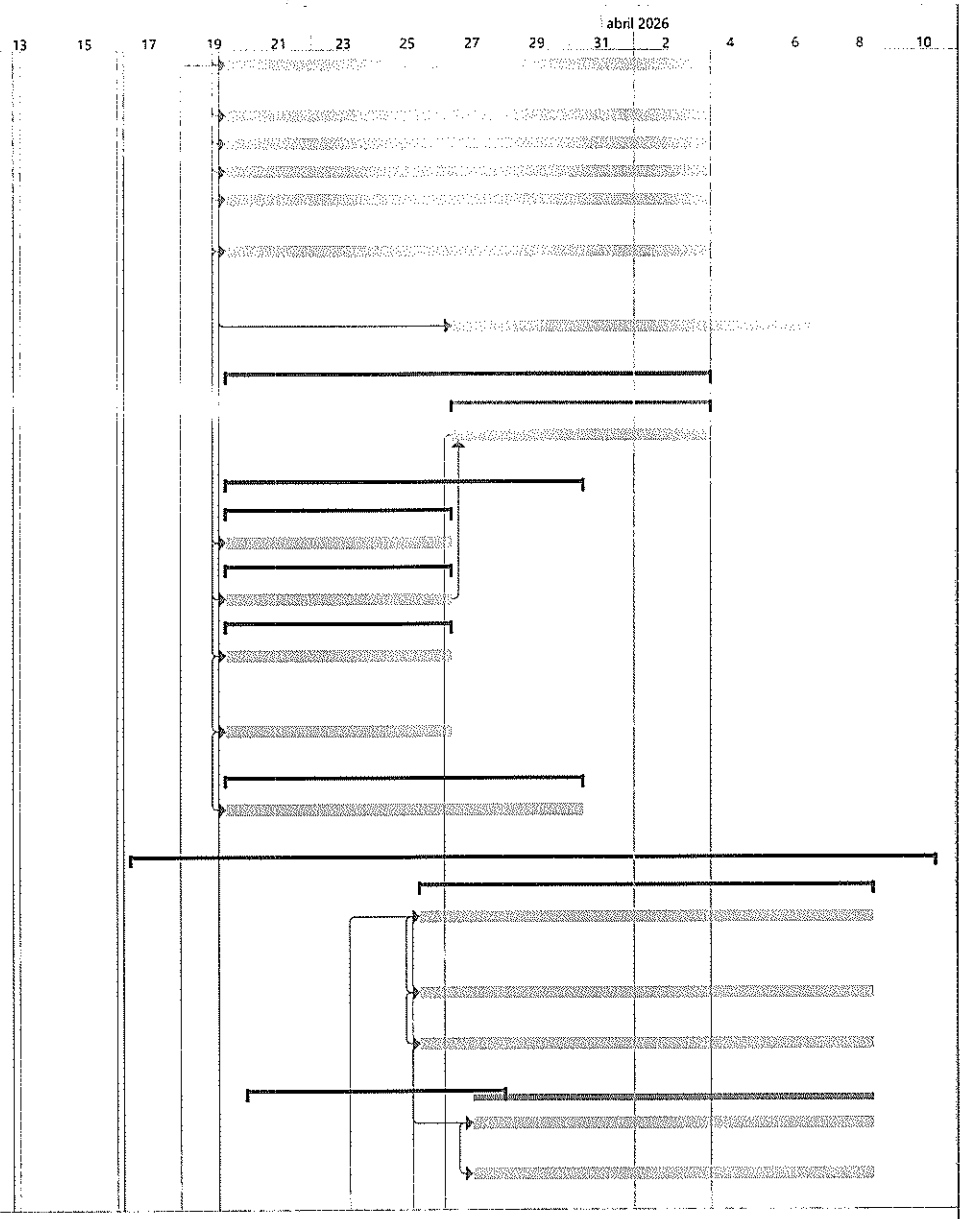

Proyecto: Cronograma Acelerad
Fecha: jue 2/04/26

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
63		**CIELO RASOS**	**7 días**	**vie 27/03/26**	**mar 7/04/26**
64		LIMPIEZA, TRATAMIENTO DE SALITRE E IMPERMEABILIZADO EN CIELO RASO	7 días	vie 27/03/26	mar 7/04/26
65		PREPARACION DE SUPERFICIE -DECAPADO	7 días	vie 27/03/26	mar 7/04/26
66		EMPASTE DE CIELO RASO CON BASE IMPRIMANTE Y LIJADO	7 días	vie 27/03/26	mar 7/04/26
67		PINTURA LATEX EN CIELORRASO (2 MANOS)	7 días	vie 27/03/26	mar 7/04/26
68		SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSAS DE FIBRACRMENTO 0.60X0.60MX4MM	7 días	vie 27/03/26	mar 7/04/26
69		SUM. E INSTALACION DE FALSO CIELO RAZO DE BALDOSAS INC. RIELES, ANGULOS Y PERFILES Y CORDONES	7 días	vie 27/03/26	mar 7/04/26
70		RELLENO, RESANE Y SELLADO DE VACÍOS EN PUNTOS DE LUZ	7 días	vie 27/03/26	mar 7/04/26
71		**PUERTAS**	**16 días**	**mar 17/03/26**	**mar 7/04/26**
72		PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA C/MARCO DE MADERA – SIN LUNETA, SEGÚN DISEÑO	9 días	jue 19/03/26	lun 30/03/26
73		PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA C/MARCO DE MADERA – CON LUNETA, SEGÚN DISEÑO	9 días	mar 17/03/26	vie 27/03/26
74		PUERTA DE ALUMINIO, CON MARCO DE ALUMINIO – SEGÚN DISEÑO	9 días	mar 17/03/26	vie 27/03/26
75		MANTENIMIENTO DE PUERTA DE MADERA (LIJADO, MASILLADO, PULIDO, PINTADO BARNIZ Y CHAPA)	15 días	mar 17/03/26	lun 6/04/26
76		MANTENIMIENTO DE PORTON METÁLICO (LIJADO, INC. REMOVER ÓXIDO, MASILLADO, BASE ANTICORROSIVA Y PINTADO)	9 días	mar 17/03/26	vie 27/03/26
77		MANTENIMIENTO DE PUERTA DE ALUMINIO (INCL. LIMPIEZA, AJUSTE DE BISAGRAS/ACCESORIOS, LUBRICACIÓN Y CORRECCIÓN DE DESALINEAMIENTOS)	11 días	lun 23/03/26	mar 7/04/26
78		MANTENIMIENTO DE PUERTA METÁLICA (LIJADO, INC. REMOVER ÓXIDO, MASILLADO, BASE ANTICORROSIVA Y PINTADO)	11 días	lun 23/03/26	mar 7/04/26
79		SUMINISTRO E INTALACIÓN MAMPARAS INTERIORES	15 días	mar 17/03/26	lun 6/04/26
80		**VENTANAS**	**17 días**	**vie 20/03/26**	**sáb 11/04/26**
81		SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA C/MARCO DE ALUMINIO CORREDIZA Y FIJA, INC, VIDRIO LAMINADO 6 MM TIPO	9 días	vie 20/03/26	mar 31/03/26
82		SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE PROTECTOR - REJA METÁLICA CON TUBO CUADRADO DE 1 1/2 X 1 1/2, E=2.5 MM.	9 días	vie 20/03/26	mar 31/03/26
83		SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA Y RIELES	9 días	lun 30/03/26	sáb 11/04/26

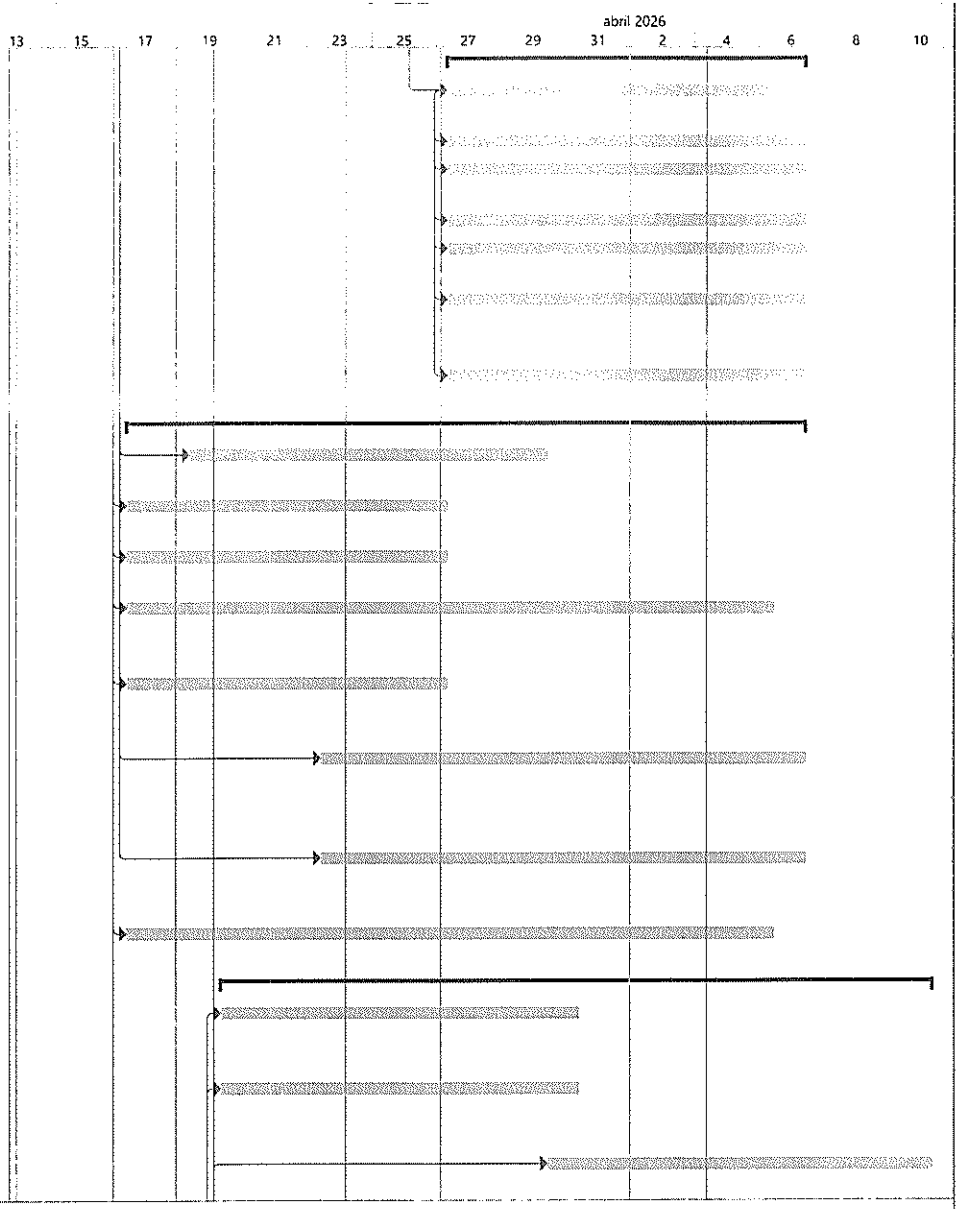

Proyecto: Cronograma Acelerad
Fecha: jue 2/04/26

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
84		MANTENIMIENTO DE PROTECTOS REJA METALICA INC. REMOVER OXIDO , MASILLADO, BASE Y PINTADO	7 días	vie 20/03/26	vie 27/03/26
85		MANTENIMIENTO DE VENTANA, CAMBIO DE PERFILES, SEGUROS, REEMPLAZO DE FELPA	12 días	vie 20/03/26	lun 6/04/26
86		**MUROS Y TABIQUES**	**18 días**	**jue 19/03/26**	**sáb 11/04/26**
87		RESANE DE FISURA	8 días	vie 20/03/26	lun 30/03/26
88		LIMPIEZA, TRATAMIENTO DE EFLORESCENCIA, RESANE EN MURO	13 días	jue 19/03/26	lun 6/04/26
89		EMPASTE DE PARED CON BASE IMPRIMANTE Y LIJADO	13 días	sáb 21/03/26	mié 8/04/26
90		PREPARACION DE SUPERFICIE -DECAPADO MURO	12 días	jue 19/03/26	sáb 4/04/26
91		PINTURA SATINADA EN MUROS INTERIORES (2 MANOS)	14 días	mar 24/03/26	sáb 11/04/26
92		PINTURA SATINADA EN MUROS EXTERIORES (2 MANOS)	10 días	sáb 28/03/26	sáb 11/04/26
93		**OTROS**	**15 días**	**lun 23/03/26**	**sáb 11/04/26**
94		**AREAS VERDES**	**2 días**	**sáb 4/04/26**	**mar 7/04/26**
95		SUMINISTRO E INSTALACION DE ÁREAS VERDE	2 días	sáb 4/04/26	mar 7/04/26
96		**ESPEJOS**	**2 días**	**sáb 4/04/26**	**mar 7/04/26**
97		SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS	2 días	sáb 4/04/26	mar 7/04/26
98		**MELAMINE**	**4 días**	**lun 6/04/26**	**vie 10/04/26**
99		SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTANTE 1.60 X 0.60	4 días	lun 6/04/26	vie 10/04/26
100		**SARDINELES**	**4 días**	**lun 6/04/26**	**vie 10/04/26**
101		DECAPADO, EMPASTADO Y PINTADO DE SARDINEL	4 días	lun 6/04/26	vie 10/04/26
102		**DRYWALL**	**2 días**	**lun 6/04/26**	**mié 8/04/26**
103		REPARACIÓN DE JUNTAS EN MUROS DE DRYWALL (INCL. TRATAMIENTO DE FISURAS, RESANE CON CINTA Y MASILLA,	2 días	lun 6/04/26	mié 8/04/26
104		**ESCALERAS**	**2 días**	**mié 25/03/26**	**vie 27/03/26**
105		MANTENIMIENTO DE BARANDA METÁLICA (LIJADO, INC. REMOVER ÓXIDO, BASE ANTICORROSIVA Y PINTADO)	2 días	mié 25/03/26	vie 27/03/26
106					
107		**TRAGALUZ PATIO**	**3 días**	**vie 27/03/26**	**mar 31/03/26**
108		MANTENIMIENTO DE BARANDA METÁLICA (LIJADO, INC. REMOVER ÓXIDO, BASE ANTICORROSIVA Y PINTADO)	3 días	vie 27/03/26	mar 31/03/26
109		**MURETE DE VIGILANCIA**	**5 días**	**lun 23/03/26**	**vie 27/03/26**
110		DECAPADO, EMPASTADO Y PINTADO DE MURETE	5 días	lun 23/03/26	vie 27/03/26
111		**COCINA**	**6 días**	**lun 23/03/26**	**lun 30/03/26**

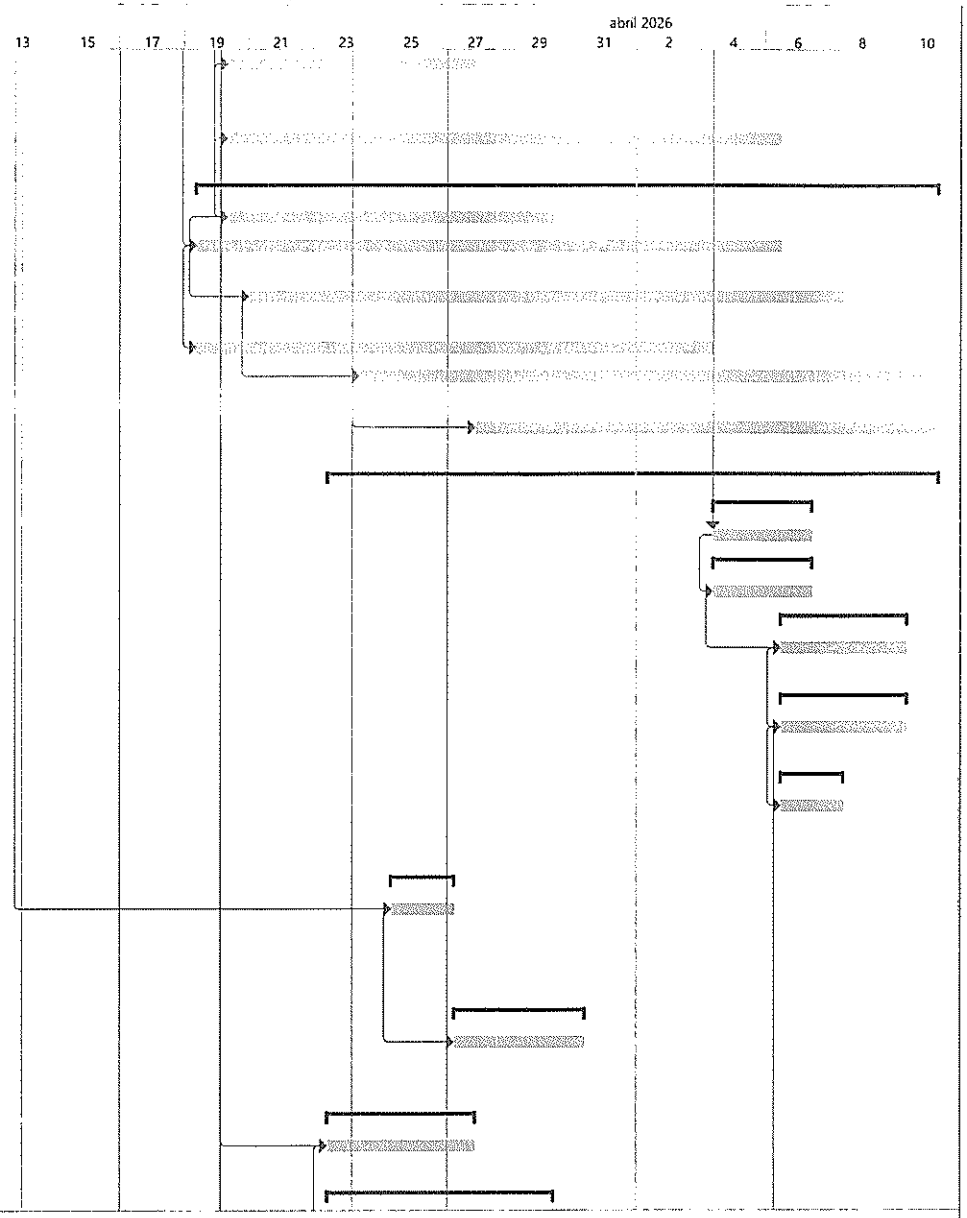

Proyecto: Cronograma Acelerad
Fecha: jue 2/04/26

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
112		SUMINISTRO E INSTALACION ZÓCALO DE CERÁMICO DE 0.60 M X 0.60 M PARA MESA DE COCINA , LAVADERO	6 días	lun 23/03/26	lun 30/03/26
113		RETIRO Y REPOSICION DE REPOSTERO DE MELAMINE CON DIVISIONES NTERIORES	4 días	mar 24/03/26	vie 27/03/26
114		**PLACA RECORDATORIA**	**4 días**	**mar 7/04/26**	**sáb 11/04/26**
115		SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA RECORDATORIA SEGUN DISEÑO	4 días	mar 7/04/26	sáb 11/04/26
116		**SEÑALIZACION**	**4 días**	**mar 7/04/26**	**sáb 11/04/26**
117		SEÑALETICA DE NOMBRE DE AMBIENTES 0.10M X 0.30M (INC. ADHESIVO + DOBLE ACRILICO CRISTAL 3MM)	4 días	mar 7/04/26	sáb 11/04/26
118		SEÑALITICA DE SEGURIDAD DE 0.20M X 0.30M (INC. ADHESIVO + DOBLE ACRILICO CRISTAL 3MM)	4 días	mar 7/04/26	sáb 11/04/26
119		SEÑALITICA DE AVISOS (ADHESIVOS + DOBLE ACRILICO CRISTAL 3MM)	4 días	mar 7/04/26	sáb 11/04/26
120		**INSTALACIONES SANITARIAS**	**12 días**	**lun 23/03/26**	**mié 8/04/26**
121		**MANTENIMIENTO CORRECTIVO**	**10 días**	**lun 23/03/26**	**lun 6/04/26**
122		CORTE,PICADO, DESMONTAJE DE TUB Y RESANE DE MURO PARA RENOVACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA FRIA	10 días	lun 23/03/26	lun 6/04/26
123		CORTE,PICADO, DESMONTAJE DE TUB Y RESANE DE MURO PARA RENOVACIÓN DE TUBERÍA DE DESAGÜE	10 días	lun 23/03/26	lun 6/04/26
124		CORTE,PICADO, DESMONTAJE DE TUB Y RESANE DE PISO PARA RENOVACIÓN DE TUBERÍA DE DESAGÜE	10 días	lun 23/03/26	lun 6/04/26
125		CORTE,PICADO, DESMONTAJE DE TUB Y RESANE DE PISO PARA RENOVACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA FRIA	10 días	lun 23/03/26	lun 6/04/26
126		**RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRIA**	**10 días**	**lun 23/03/26**	**lun 6/04/26**
127		TUBERÍA PVC DE AGUA CLASE 10 - 1/2 AGUA FRIA	10 días	lun 23/03/26	lun 6/04/26
128		TUBERÍA PVC DE AGUA CLASE 10 - 3/4 AGUA FRIA	10 días	lun 23/03/26	lun 6/04/26
129		TUBERÍA PVC DE AGUA CLASE 10 - 1 AGUA FRIA	10 días	lun 23/03/26	lun 6/04/26
130		CODO PVC - SAP CLASE 10 R 1/2 X 90	10 días	lun 23/03/26	lun 6/04/26
131		CODO PVC - SAP CLASE 10 R 3/4 X 90	10 días	lun 23/03/26	lun 6/04/26
132		CODO PVC - SAP CLASE 10 R 1 X 90	10 días	lun 23/03/26	lun 6/04/26
133		CODO REDUCTOR 3/4 A 1 PVC - SAP CLASE 10	10 días	lun 23/03/26	lun 6/04/26
134		TEE PVC - SAP CLASE 10 R 1/2 X 90	10 días	lun 23/03/26	lun 6/04/26
135		SALIDA DE AGUA FRIA - D=1/2 PVC SAP	10 días	lun 23/03/26	lun 6/04/26
136		TAPA DE NICHO PARA VALVULA O LLAVE DE PASO	10 días	lun 23/03/26	lun 6/04/26
137		VÁLVULA O LLAVE DE PASO D=1/2 (BRONCE CROMADO), INC. ACCESORIOS	10 días	lun 23/03/26	lun 6/04/26

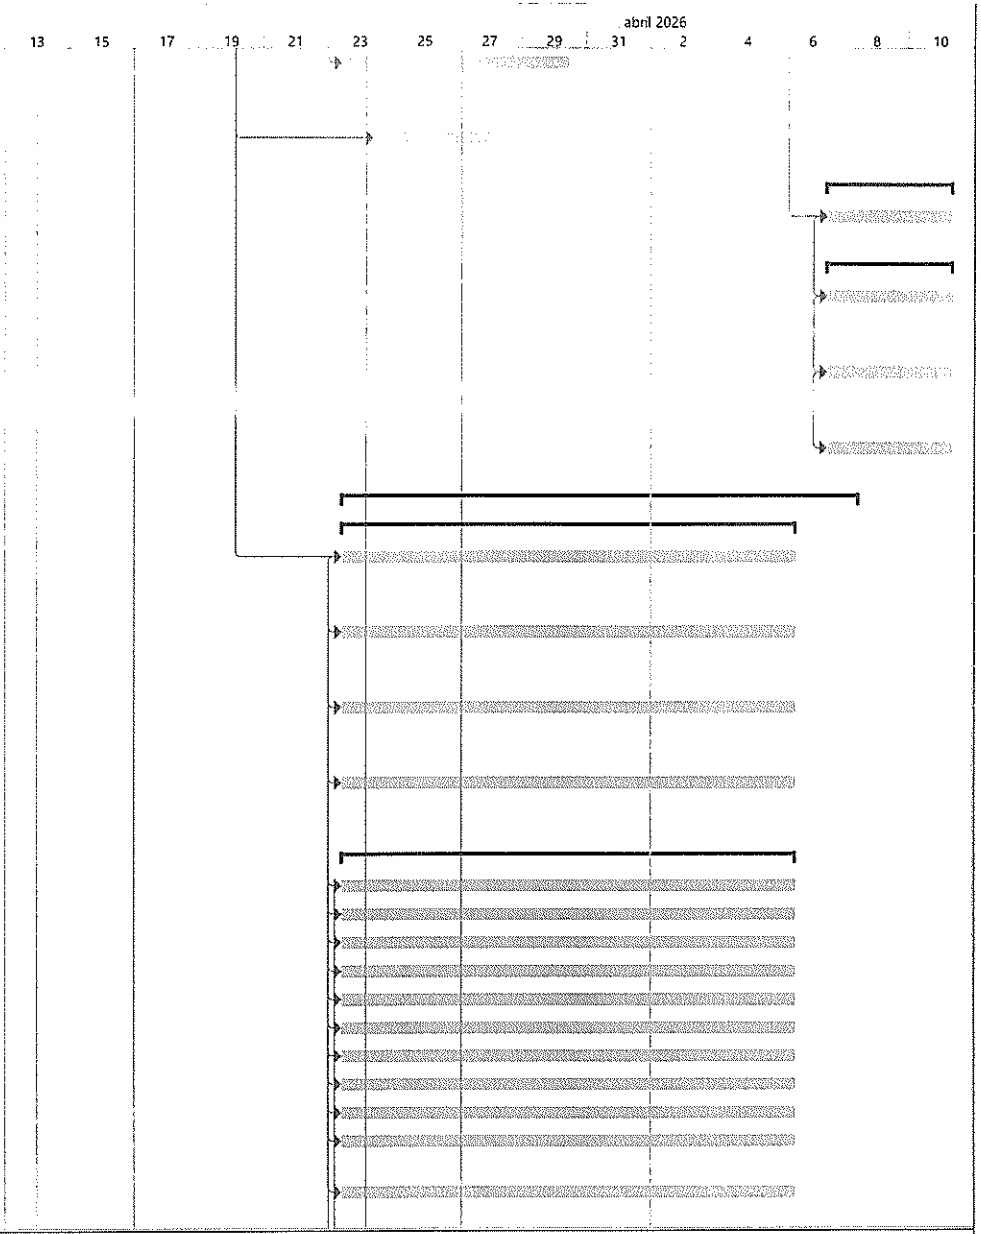

Proyecto: Cronograma Acelerad
Fecha: jue 2/04/26

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
138		PRUEBA HIDRÁULICA	10 días	lun 23/03/26	lun 6/04/26
139		**RED DE DISTRIBUCIÓN DE DESAGUE**	**10 días**	**mar 24/03/26**	**mar 7/04/26**
140		TUBERÍA PVC DE DESAGÜE 2	10 días	mar 24/03/26	mar 7/04/26
141		TUBERÍA PVC DE DESAGÜE 4	10 días	mar 24/03/26	mar 7/04/26
142		YEE PVC - SAL 4X4	10 días	mar 24/03/26	mar 7/04/26
143		YEE PVC - SAL 4X2	10 días	mar 24/03/26	mar 7/04/26
144		YEE PVC - SAL 2X2	10 días	mar 24/03/26	mar 7/04/26
145		CODO PVC - 2X 45°	10 días	mar 24/03/26	mar 7/04/26
146		CODO PVC - 4X 45°	10 días	mar 24/03/26	mar 7/04/26
147		REDUCCIÓN PVC - SAL 4X2	10 días	mar 24/03/26	mar 7/04/26
148		SALIDA DE DESAGÜE EN PVC SAP, D=2	10 días	mar 24/03/26	mar 7/04/26
149		SALIDA DE DESAGÜE EN PVC SAP, D=4	10 días	mar 24/03/26	mar 7/04/26
150		SUMIDERO DE BRONCE DE 2, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	10 días	mar 24/03/26	mar 7/04/26
151		REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	10 días	mar 24/03/26	mar 7/04/26
152		PRUEBA HIDRÁULICA DE ESCORRENTÍA DE TUBERÍAS DE DESAGÜE	10 días	mar 24/03/26	mar 7/04/26
153		**SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	**7 días**	**jue 26/03/26**	**lun 6/04/26**
154		LAVATORIO DE LOSA VITRIFICADA TIPO MANANTIAL, C/GRIFERIA PERILLA PESADO INC. ACCESORIOS	7 días	jue 26/03/26	lun 6/04/26
155		GRIFERIA	7 días	jue 26/03/26	lun 6/04/26
156		INODORO TANQUE BAJO DE LOSA 1RA CALIDAD ADULTO, INC. ACCESORIOS	7 días	jue 26/03/26	lun 6/04/26
157		LLAVE DE DUCHA S/SALIDA CROMADA C/MESCLADORA INC. ACCESORIOS	7 días	jue 26/03/26	lun 6/04/26
158		URINARIO DE LOSA BLANCO TIPO CADET	7 días	jue 26/03/26	lun 6/04/26
159		**SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE**	**2 días**	**lun 30/03/26**	**mié 1/04/26**
160		**MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO**	**2 días**	**lun 30/03/26**	**mié 1/04/26**
161		MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO DE 1100 LT, INC. CAMBIO DE MULTICONECTOR, VALVULA FLOTADORA, VISOR Y ACCESORIOS	2 días	lun 30/03/26	mié 1/04/26
162		**DRENAJE PLUVIAL**	**7 días**	**sáb 28/03/26**	**mié 8/04/26**
163		CANALETA DE PVC 4	7 días	sáb 28/03/26	mié 8/04/26
164		ABRAZADERA DE METAL PARA CANALETA DE 4	7 días	sáb 28/03/26	mié 8/04/26
165		ABRAZADERA 02 OREJAS DE METAL (2mm) X 4	7 días	sáb 28/03/26	mié 8/04/26
166		TUBERIA PVC, D=4	7 días	sáb 28/03/26	mié 8/04/26
167		CODO PVC SAL 4X90°	7 días	sáb 28/03/26	mié 8/04/26
168		**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**20 días**	**mar 17/03/26**	**sáb 11/04/26**
169		**HABILITACIÓN Y MONTAJE DE LUMINARIAS, INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES**	**7 días**	**mar 17/03/26**	**mié 25/03/26**

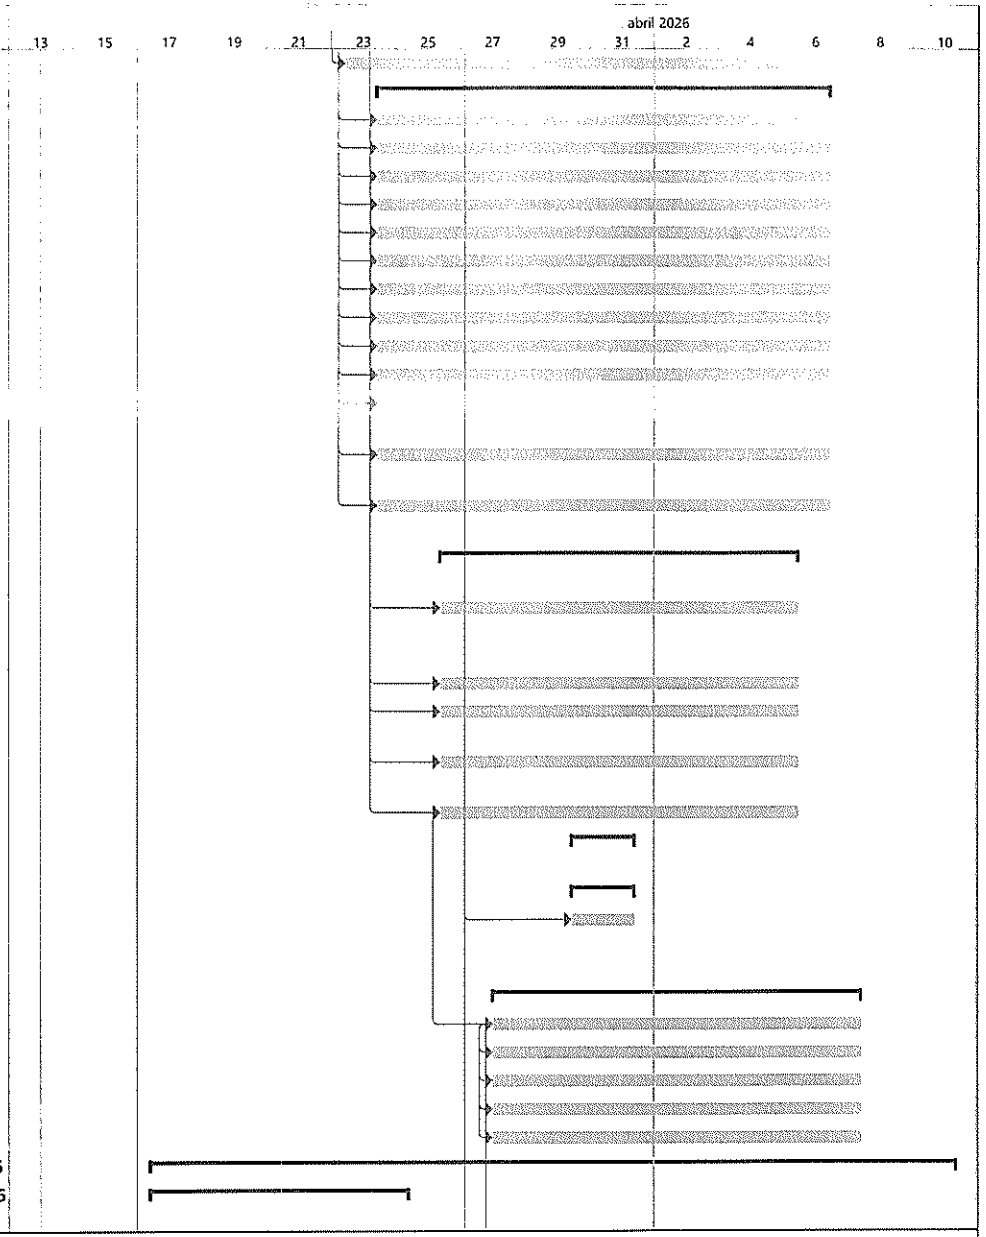

Proyecto: Cronograma Acelerad
Fecha: jue 2/04/26

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo	Fecha límite
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin	Progreso
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas	Progreso manual
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
170		HABILITACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA	7 días	mar 17/03/26	mié 25/03/26
171		HABILITACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE	7 días	mar 17/03/26	mié 25/03/26
172		HABILITACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIFILAR SIMPLE	7 días	mar 17/03/26	mié 25/03/26
173		**MANTENIMIENTO CORRECTIVO**	**17 días**	**mar 17/03/26**	**mié 8/04/26**
174		MANTENIMIENTO POZO A TIERRA	5 días	mar 31/03/26	mié 8/04/26
175		REEMPLAZO DE TABLERO GENERAL	5 días	mar 31/03/26	mié 8/04/26
176		PICADO Y RESANE DE MURO Y CIELO RASO P/EMPOTRAR TUBERIAS DE LUZ	10 días	mar 17/03/26	vie 27/03/26
177		PICADO Y RESANE DE MURO Y PISO P/EMPOTRAR TUBERIAS DE TOMACORRIENTES	10 días	mar 17/03/26	vie 27/03/26
178		PICADO Y RESANE DE MURO Y CIELO RASO P/EMPOTRAR TUBERIAS DE INTERRUPTOR UNIFILAR SIMPLE	10 días	mar 17/03/26	vie 27/03/26
179		**RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉTRICA EMPOTRADO**	**13 días**	**mar 17/03/26**	**mié 1/04/26**
180		TUBERIA PVC - SAP DE 25 MM	13 días	mar 17/03/26	mié 1/04/26
181		CABLE ELECTRICO NH80, 2.5 MM2	13 días	mar 17/03/26	mié 1/04/26
182		CABLE ELECTRICO NH80, 4.0 MM2	13 días	mar 17/03/26	mié 1/04/26
183		**SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, LUCES DE EMERGENCIA Y TOMACORRIENTES**	**6 días**	**sáb 28/03/26**	**mar 7/04/26**
184		MONTAJE DE LUMINARIA PRISMATICO 1200X300 LED 36W (INCLUYE CABLEADO)	6 días	sáb 28/03/26	mar 7/04/26
185		MONTAJE DE LUMINARIA 60X60 PANEL LED 36W (INCLUYE CABLEADO)	6 días	sáb 28/03/26	mar 7/04/26
186		MONTAJE DE LUMINARIA DOWLIGHT REDONDO ADOSADO LED 36W (INCLUYE CABLEADO)	6 días	sáb 28/03/26	mar 7/04/26
187		MONTAJE DE LUZ DE EMERGENCIA (INCLUYE CABLEADO)	6 días	sáb 28/03/26	mar 7/04/26
188		MONTAJE DE TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL	6 días	sáb 28/03/26	mar 7/04/26
189		MONTAJE DE INTERRUPTOR SIMPLE	6 días	sáb 28/03/26	mar 7/04/26
190		MONTAJE DE ALARMA CONTRA INCENDIOS A BATERIA	6 días	sáb 28/03/26	mar 7/04/26
191		**SISTEMA DE BOMBEO**	**8 días**	**mar 31/03/26**	**sáb 11/04/26**
192		ELECTROBOMBA 1.5 HP INCLU. CABLEADO, ACCESORIOS Y TUBERIAS	4 días	mar 31/03/26	mar 7/04/26
193		TABLERO AUTOMATICO PARA CONTROL DE LECTROBOMBA, CABLEADO, ACCESORIOS Y TUBERÍAS	4 días	mar 7/04/26	sáb 11/04/26
194		**PRUEBAS SISTEMA ELÉCTRICO**	**3 días**	**mié 8/04/26**	**sáb 11/04/26**
195		PRUEBAS, MEDIDAS ELÉCTRICAS Y PUESTA EN SERVICIO	3 días	mié 8/04/26	sáb 11/04/26

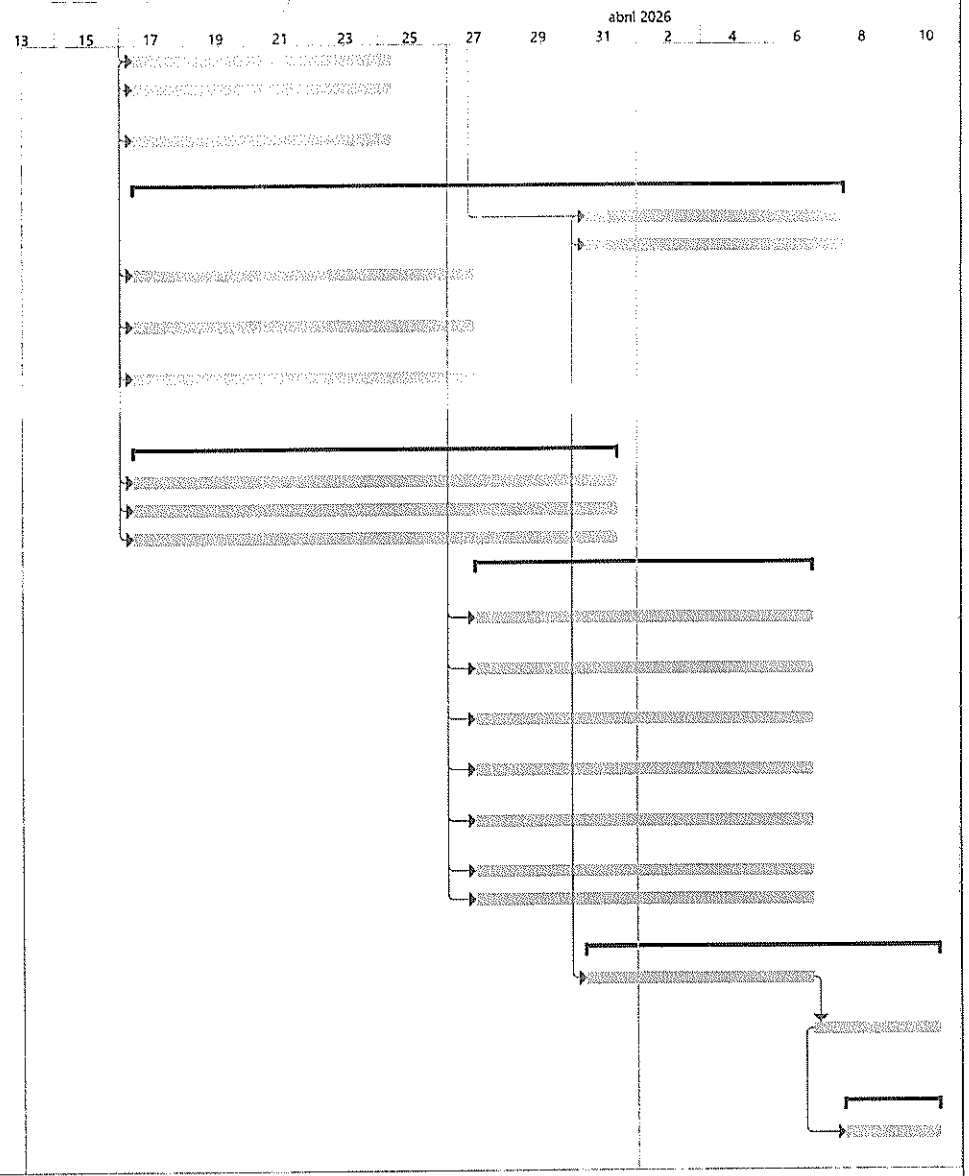

Proyecto: Cronograma Acelerad
Fecha: jue 2/04/26

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	
